

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2025.12.31.

민선8기 공약사항 보고회 자료



동 두 천 시
기 획 감 사 담 당 관

|| 목 차 ||

홍보 미래 담당관

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|---|
| 1. 제생병원 대학병원으로 조기개원 및 의대설립 추진(장기) ... | 미래발전팀장 | 윤미옥 | 4 |
| 2. 구도심 도시재생사업 기반 마련(장기) | 공여지개발팀장 | 이민우 | 6 |

문화예술과

- | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|---|
| 3. 문화예술의 전당 건립 추진(장기) | 문화예술팀장 | 이득만 | 8 |
|-----------------------------|--------|-----|---|

일자리경제과

- | | | | |
|---|---------|-----|----|
| 4. 국가산업단지 조성(30만평 확대 추진, 신재생에너지 산업 유치)(장기) .. | 기업조성팀장 | 이충원 | 10 |
| 5. 경기도 일자리재단 이전 추진(중기) | 일자리정책팀장 | 이수원 | 12 |

공원녹지과

- | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|----|
| 6. 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진(중기) | 공원녹지팀장 | 김태형 | 15 |
| 7. 반려동물 테마파크 조성 추진(장기) | 공원시설팀장 | 백수현 | 18 |

안전총괄과

- | | | | |
|------------------------------|------|-----|----|
| 8. 신천 친수공간 조성(1)(중기) | 하천팀장 | 이창희 | 21 |
| 8-1. 신천 친수공간 조성(2)(중기) | 하천팀장 | 이창희 | 23 |

교통행정과

- | | | | |
|------------------------------|--------|-----|----|
| 9. GTX-C 동두천 연장 추진(중기) | 교통행정팀장 | 이상훈 | 26 |
|------------------------------|--------|-----|----|

도로과

- | | | | |
|---|--------|-----|----|
| 10. 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)(장기) ... | 도로건설팀장 | 강수룡 | 30 |
|---|--------|-----|----|

도시재생과

- | | | | |
|---|--------|-----|----|
| 11. GTX-C노선 연장에 따른 환승시설 도시계획 수립(장기) | 도시계획팀장 | 강문성 | 32 |
|---|--------|-----|----|

건축과

- | | | | |
|---|------|-----|----|
| 12. 청년 및 신혼부부를 위한 공공임대 주택 건립 추진(장기) | 주택팀장 | 김혜정 | 35 |
|---|------|-----|----|

공공사업과

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|----|
| 13. 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치(중기) | 공공개발팀장 | 강민수 | 37 |
| 14. 노인 및 장애인 화관 건립(중기) | 건축시설팀장 | 김재상 | 39 |

[서면보고]

기획감사담당관

- | | | | |
|--|------|-----|----|
| 1. [완료] 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진(단기) | 기획팀장 | 조철호 | 42 |
|--|------|-----|----|

자치행정과

- | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|----|
| 2. [완료] 공정한 인사정책 시행(단기) | 인사팀장 | 김현철 | 44 |
| 3. [완료] 동두천시 시설관리공단 설립 추진(단기) | 공단TF팀장 | 김태우 | 46 |

정보통신과

- | | | | |
|---|--------|-----|----|
| 4. [완료] 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진(중기) | 정보통신팀장 | 김경환 | 48 |
|---|--------|-----|----|

5. [완료] 디지털 플랫폼 교육센터 운영(단기)	정보보호팀장	유진만	50
6. [완료] 지능형 CCTV 확충 및 우리에게 맞는 시스템 강화(중기)	영상정보팀장	오용환	52
사 회 복 지 과			
7. [완료] 지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화(단기)	아동복지팀장	김순희	54
가 족 지 원 과			
8. [완료] 영·유아 보육시설 교구, 교재 지원(단기)	보 육 팀 장	최민희	57
9. [완료] 보육교직원 복지 혜택 확대(단기)	보 육 팀 장	최민희	59
10. [완료] 청년창업지원센터 건립 추진(중기)	청소년지원팀장	이현주	61
11. [완료] 청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련(중기) ..	청소년지원팀장	이현주	63
12. [완료] 다문화가족 자녀 사회포용안전망(취학전 기본학습, 취업컨설팅)사업(단기)	이민사회지원팀장	김경희	65
문 화 예 술 과			
13. [완료] 문화예술 도시 및 문화 트렌드 개발(단기)	문 화 예 술 팀 장	이득만	67
체 육 관 광 과			
14. [완료] 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영(단기)	반다비센터팀장 장애인복지팀장	정희광 권민정	69
15. [완료] 아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원(단기)	체 육 진 흥 팀 장	전성희	71
일 자 리 경 제 과			
16. [완료] 소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대(단기)	경 제 팀 장	서기석	73
17. [완료] 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원(단기)	경 제 팀 장	서기석	75
18. [완료] 저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화(단기)	에 너 지 팀 장	채미정	77
19. [완료] 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진(장기)	일자리정책팀장	이수원	79
환 경 보 호 과			
20. [완료] 친환경 차량 보급 확대(중기)	대기관리팀장	조용희	81
21. [완료] 친환경 차량 충전 기반시설 확충(중기)	대기관리팀장	조용희	83
22. [완료] 신천 수질개선 종합대책 추진(장기)	수질총량팀장	김택수	84
농 업 축 산 위 생 과			
23. [완료] 등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련(단기) ...	동 물 복 지 팀 장	양정연	88
도 로 과			
24. [완료] 교통약자를 배려하는 길(중기)	도로정비팀장	강동명	91
건 강 증 진 과			
25. [완료] 초등학생 대상 치과 증진 사업 확대(단기)	건강증진팀장	김혜원	93
26. [완료] 동두천시 산후조리비 지원(단기)	건강증진팀장	김혜원	96
27. [완료] 비대면 치매 조기검진 시스템 도입(단기)	치매안심센터팀장	신미숙	98
미 래 교 육 진 흥 원			
28. [완료] 초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기회 확대 (단기)	교육지원팀장	홍성지	100
29. [완료] 교원 연구개발 활동 지원(교원 국내·외 연수 기회 확대)(단기)	교육지원팀장	홍성지	103

1 제생병원 대학병원으로 조기개원 및 의대설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	장기	임기후	민간	계속	추진중	비예산
홍보미래담당관	미래발전팀장	윤미옥 ☎ 2725, 담당자	남상준 ☎ 2445			
보건행정과	의약관리팀장	신지혜 ☎ 3378, 담당자	유재혁 ☎ 3377			

□ 사업개요

- 위 치 : 지행동 산27번지 일원
- 건축현황 : 종합의료시설 142,435㎡ (43,162평)
- 준공예정 : 2026년 하반기(별관동) * 임시사용승인
- 건축규모 : 지하 4층, 지상 21층(본관동) / 지하 1층, 지상 12층(별관동)
- 병 상 수 : 1,405병상(본관동 1,190 / 별관동 215)
- 사업현황
 - 별관동 건축 및 조경, 토목 공사(진입로, 주차장 등) 완료
 - 인접 대지 건축물 철거 공사(기둥, 벽) 착공(2026년 3월 중 준공 예정)
 - 기계설비 시험 가동 및 운영 준비 작업 중

□ 필요성

- (별관동) 제생병원의 개원으로 지역경제 활성화 및 의료복지 접근성 상승
- (본관동) 경기 북부 의과대학 유치를 통해 의료체계 개선 및 향상된 공공 의료 환경 제공

□ 추진 현황

- (별관동) 제생병원 준공 및 개원
 - 2025. 1. 22. : 제생병원 별관동 개원 관련 분당 제생병원 방문
 - 2025. 2. 18. : 별관동 종합병원 개원을 위한 시-대진의료재단 간담회 개최
 - 2025. 5. 26. : 제생병원 개원을 위한 분야별 실무 점검 회의(1차)
 - 2025. 6. 5. : 제생병원 개원을 위한 분야별 실무 점검 회의(2차)
 - 2025. 7. : 기반 공사(진입로, 주차장 등) 완료
 - 2025. 8. 7. : 제생병원 개원을 위한 분야별 실무 점검 회의(3차)
 - 2025. 8. 11. : 제생병원 개원 관련 법령 검토 요청(시 → 도, 보건복지부)
 - 2025. 11. 4. : 제생병원 개원을 위한 분야별 실무 점검 회의(4차)
 - 2025. 12. 15. : 인접 대지 건축물 철거 공사(기둥, 벽) 착공

○ (본관동) 의대설립추진

- 2025. 4. 28. : 동두천·포천 공공의대 - 21대 대선 건의 채택 * 공동 대응
- 2025. 5. 26. : 동두천·포천 공공의대 - 경기 북부 대개발 사업 제출 * 공동 대응
- 2025. 7. 23. : 경기도시장군수협의회 건의사항 제출(중앙정부 정책 건의)
- 2025. 9. 23. : 동두천·대진대 - 의대 유치 점검 회의 * 부시장 주재(대진대 부총장 참석)

□ 주요 현안 및 향후 계획

○ (제생병원 별관동 개원) 2026년 상반기 임시사용승인 목표로 사업 진행

(문 제 점)	인접 대지로 침범된 건축물 철거(또는 해당 소유권 확보) 의료재단 측 계획 필요 및 임시사용승인 이후 개원까지의 난항 예상
(대 책)	분야별 필수 법적 절차 이행 독려 및 행정 지원 병행, 필수 의료분야가 포함된 병원으로의 개원을 위한 의견 조율 활동 추진

○ (의대설립) 접경지 의료환경에 특수성을 반영하고 낙후된 의료체계를 동시에 개선할 수 있는 경기 북부 의과대학 추진

(대응 방향)	現 정부 의료 핵심 공약인 공공의대 신설 논의에 맞춰 접경지 연합(경기 북부·강원 북부) 전략적 정부 건의 추진 시민 활동 및 토론회 개최 등 연대 활동 실행 (지역 국회의원 협조 필수)
----------------	---

□ 민선 8기 로드맵

○ 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
별관동 공사																					
의료기관 개설 허가																					
의대설립 추진																					

○ 사업 달성 확인 지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 6월말	2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년			
별관동 공정률	%	100	50	80	97	100			
의과대학 설립 추진율	%	100	10	30	50	70	100		

2

구도심 도시재생사업 기반 마련

※ 도지사 공약(110번) : 소요산 보산동 관광특구 개발 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 관광산업과 관광기반팀장 안선미 ☎ 8008-4731

동두천시 홍보미래담당관 공여지개발팀장 이민우 ☎ 2728, 담당자 김수빈 ☎ 2734

□ 사업개요

- 기간 : 2022.~2027.
- 위치 : 보산동 466-1번지 일원[캠프모빌(파슬1)]
- 면적 : 50,470m²
- 사업내용 : 캠프모빌 파슬 1 토지매입
- 소요예산 : 21,600백만원 (국 17,300, 시 4,300) ※ 사업조성비 미포함

□ 주요내용

- 파슬1 국방부 환경정화사업
- 2023년 발전종합계획 변경(공원, 도로, 유통상업단지 → 공원) 추진
- 발전종합계획 변경에 따라 토지 매입(분납) 추진

조성 가능한 공원시설의 종류 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 별표1]

5. 교양시설 : 도서관 및 독서실, 온실, 야외극장, 문화예술회관, 미술관 및 박물관, 역사적·학술적 가치가 높은 시설, 공연장 및 전시장, 민속놀이마당 등

□ 추진실적

- 2022. 5. ~ 2023. 8. : 기지이전사업단 환경정화사업 기본 및 실시설계
- 2023. 2. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 신청(캠프모빌 공원 부지 위치 변경 / 파슬1, 2 → 파슬1)
- 2023. 8. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 승인(캠프모빌)
- 2024. 5. : 시 환경보호과, 기지이전사업단에 캠프모빌 파슬1 환경정화 명령
- 2024. 6. : 파슬1 협약에 의한 매입비 100억원 1회차 분납
- 2024. 6. : 기지이전사업단 환경정화 사업 착수(최대 4년 소요)
- 2024. 12. : 파슬1 협약에 의한 매입국비 72억원 추가확보 후 2회차 분납

□ **문제점** : 기지이전사업단 환경정화에 3년 소요 예상 (2024. 6. ~ 2027. 상반기)

□ **향후 추진계획**

- 협약대금 잔액(4,413백만원) 분납 추진 및 환경정화 완료 후 감평에 따른 차액 지급과 명의이전 실시(2026년 2,641백만원 납부 예정)

□ **기대효과**

- 캠프모빌 파슬1 토지매입으로 구도심 도시재생 사업을 위한 기반 마련

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
환경정화 기본 및 실시설계					■	■	■	■													
환경정화 추진													■	■	■	■	■	■	■	■	국방부
발전종합계획 변경					■	■	■	■													
토지매입									■	■	■	■							■	■	토지정화 전 잔액 분납

- 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2024년	2025년	2026년	이후	
계	21,600		17,187		2,641	1,772	조성비 미포함
국비	17,300		15,187		2,113		
도비							
시비	4,300		2,000		528	1,772	
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2027년
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
환경정화 기본 및 실시설계	식	준공		준공				
환경정화 추진	식	착공			착공			
발전종합계획 변경	식	변경		변경				
토지매입비 협약에 의한 분납	%	100			80	80	91	100

3 문화예술의 전당 건립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-40	장기	임기후	동두천시	신규	추진중	국·시비

문체부 공연전통예술과장 강연경 ☎ 044-203-2731, 담당자 조우신 ☎ 044-203-2744
 문화예술과 문화예술팀장 이득만 ☎ 2070, 담당자 유재복 ☎ 2105

□ 사업개요

- 기간 : 2022.~2028.
- 사업예정지 : 동두천시 생연동 428-5 일원
- 예상사업비 : 70,000백만원(국비 35,000백만원, 지방비 35,000백만원)
- 규모 : 부지면적 26,690㎡, 연면적 10,000㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업내용 : 전문 중공연장 및 전시공간 조성
 - 중공연장(700석), 전시실, 출연자휴게실, 분장실, 접견실, 주차장(200면이상) 등

□ 추진실적

- 사례조사를 위한 벤치마킹
 - 2022. 7. : 남양주 다산아트홀, 구리아트센터
 - 2022. 11. : 고양시 어울림누리, 아람누리
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 사업비 2회 추경 반영
 - 2022. 8. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 추진을 위한 계획수립
 - 2022. 9. : 2회 추경 확정(1억원)
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 실시
 - 2022. 11. : 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 1, 2차 공고
 - 2022. 12. : 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 개최 및 업체 선정
- 2023. 5. 3. : 중간보고회 개최
- 2023. 8. 7. : 부지선정 관련 실무회의 개최
- 2023. 10. 6. : 최종보고회 개최
- 2023. 10. 16. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 준공
- 2024. 4. : 미군 공여지(캠프케이시·호비) 토지매입 지원금 사업 건의서 제출
- 2024. 11. : 지역구 국회의원(김성원) 현안사업 건의
- 2025. 5. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 수요조사 제출
- 2025. 7. : 경기도 발전종합계획(안) 공청회 안건 발표

□ **문제점 및 대책**

- 대규모 예산이 수반되는 사업으로 국도비 보조금 지원 필요
- 정부 재정분권정책에 따라 균형발전특별회계 일부 사업(문예회관 건립) 지방이양사업으로 변경되어 국비확보 난항 예상됨

□ **향후 추진계획**

- 2026. 1. ~ 2026. 12. : 사전절차 추진(예비타당성, 중앙투자심사 등)
- 2027. 1. ~ 6. : 건축설계 공모, 기본 및 실시설계 용역(경기도 건설기술 심의)
- 2027. 7. ~ 2029. 12. : 공사 착공 및 준공

□ **기대효과**

- 전문공연장을 조성하여 양질의 공연 제공을 통해 외부 인구유입
- 접근성 강화로 시민의 문화복지 수준의 질적 향상 도모

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역																			
사전절차 추진																			
설계공모 및 공사 추진																			

- 소요예산액(예정)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	70,000		100				69,900	
국비	35,000						35,000	
도비								
시비	35,000		100				34,900	
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 6월말	2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
기본계획 수립 및 타당성검토 용역	건	1		1					
사전절차 추진	건	1					1		
설계공모 및 공사추진	건	2					1	1	

4

국가산업단지 조성(30만평 확대, 신재생에너지 산업 유치)

※ 도지사 공약(42번) : 동두천시 국가산단 확대 개발 지원

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑫, 6-㉓	장기	임기후	LH	계속	추진중	민자 등

경기도 산업입지과 산단조성팀장 김진표 ☎ 8030-3091

동두천시 일자리경제과 기업조성팀장 이충원 ☎ 2593, 담당자 이정은 ☎ 2596

□ 사업개요

- 사업위치 : 1단계 조성 사업지(상패동 동두천교차로) 서남측 일원
- 사업기간 : 2019.~2031.
- 사업규모 : 산업단지 조성 585,802㎡(17.7만평)
 ※ 총 852,519㎡(25.8만평) 중 1단계 266,717㎡(8.1만평), 2단계 585,802㎡(17.7만평)
- 총사업비 : 약 269,500백만원

□ 추진현황

- 2019. 1. : 국무조정실 현안 점검 회의(1단계 착공 시 2단계 추진)
- 2021. 12. : 2단계 확대 개발 기본구상 용역 수행(LH)
 ※ 용역 결과 미공개
- 2021. 12. ~ 2023. 8. : 2단계 수요 조사 및 사업타당성조사 용역 수행(1 ~ 3차)
 - 기업 입주수요 부족으로 용역 중단
 - 1단계 분양률 및 수요 확보 등 사업 추진 여건을 고려하여 추가 용역 및 예타 신청
- 2022. 9. ~ 2024. 5. : 국가산업단지 조성 관계기관 회의(7회)
- 2023. 2. ~ 2025. 6. : 2단계 확대 개발 조속 추진 건의(11회)
- 2025. 12. : 국가산업단지 개발계획 변경 고시(4개 업종 추가 및 중복 배치)

□ 문제점 및 대책

- 예비타당성 조사 신청 지연에 따른 조성원가 상승 우려
- 1단계 산업시설용지 분양률 제고 및 앵커기업 확보에 총력

□ 추진계획

- 2026. 2. : 국가산업단지 관리기본계획 변경(업종 추가 반영)
- 2026. 상반기 : 입주업종 변경을 통해 상반기 중 분양률 20% 달성
- 2026. 상반기 : 분양률 제고를 바탕으로 2단계 사업타당성조사 개시 요청

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신재생에너지 등 수요발굴																					
기본계획수립 및 사업타당성(수요조사)조사(LH) 예비타당성조사																					
산업단지계획 신청·승인																					

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
신재생에너지 등 수요발굴	식	수요발굴		수요발굴	수요발굴	수요발굴	수요발굴	수요발굴
예비타당성조사	식	신청·승인				신청·승인		
산업단지계획 신청·승인	식	신청·승인				신청	승인	

5

경기도 일자리재단 이전 추진

※도지사 공약(225번) : 공공기관 이전 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기후	동두천시	신규	추진중	민자·자체
경기도 공공기관담당관 공공기관지원팀장 안정선 ☎ 8008-4990						
경기도 일자리경제정책과 일자리기획팀장 김홍관 ☎ 8008-8106						
동두천시 일자리경제과 일자리정책팀장 이수원 ☎ 2483, 담당자 배종곤 ☎ 2369						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9.~2027. 12.
- 총사업비 : 33,240백만 원
 - 일자리재단 : 22,100백만 원[6,300백만 원(토지매입비)+15,800백만 원(건축비)]
 - 일자리재단·동두천시 공동부담 : 약11,140백만 원[정화 및 검증비]
 - ※ 개정된 토양환경보전법 불소 기준 적용 시 정화비용 333백만 원으로 감소(소급적용 안됨)
- 대 상 지 : 동두천시 상패동 19번지 일원
- 면 적 : 10,124㎡(잡종지 9,805, 구거 319)
- 사업내용
 - 2차 공공기관 이전 공모에 따른 경기도 일자리재단 이전 추진
 - 총 이전규모 : 경영기획실, 북부사업본부 등 일반직 직원

□ 추진계획

- 경기도 일자리재단 이전부지 정화 및 검증(오염토양 15,768㎡, 2지역)
 - 사업기간 : 약 2년
 - 정화 및 검증 비용 : 11,140백만 원
 - 정화설계, 정화사업, 정화검증비용 약 11,140백만 원 추정
 - ※ (매매계약서 특약사항 2호)정화는 동두천시가 실시하고 그 비용은 추후 양 기관 합의 부담
- 경기도 일자리재단 신축공사
 - 사업기간 : 약 2년
 - 신축비용 : 15,800백만 원
 - 신축규모 : 총 5층(지하 1층/ 지상 4층)

□ 추진실적

- 2020. 9. : 경기도일자리재단 이전 확정(동두천시)
- 2021. 6. : 국유재산(국방부) 부지매입, 소유권 이전 등기 완료
- 2022. 5. : 경기도일자리재단 이전 부지 매매계약 체결(동두천시·재단)
- 2022. 6. ~ 8. : 토양오염 정밀조사 용역
- 2024. 1. ~ : 토양환경보전법 개정 관련 환경부 건의 및 경기도 협의
- 2025. 6. : 정화사업 실시설계용역 준공

□ 문제점 및 대책

- 막대한 토양오염 정화비용 11,140백만 원이 들어가는 일자리재단 이전 사업이 2027년까지 사업 완료가 어려우므로, 기존부지로의 일자리재단 이전사업 취소 대응 방안 협의 필요
- 대체부지로 이전 및 기존부지 반환 등 대안 검토 후 향후 경기도 및 일자리재단 새로운 이전사업 계획 결정에 따라 이전 추진

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계	■																
불소 기준 완화 개정					■												환경부
협의 완료 후 이전 추진									■								2027.12.준공

- 소요예산액(실시설계 추정 금액)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	33,240	6,300	113			26,827	
국비							
도비							
시비	11,140		113			11,027	
재단	22,100	6,300				15,800	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
임시사무소 개소	식	완료		완료				
청사 신축	개소	준공				착수		준공 (2027.12.)

6 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

행정안전부 지역균형발전과장 이형석 ☎ 044-205-3501, 접경지역발전팀장 김언호 ☎ 044-205-3511
 공원녹지과 공원녹지팀장 김태형 ☎ 2413, 담당자 박용균 ☎ 2412

□ 사업개요 및 목표

○ 사업개요

- 기간 : 2022.~2026.(5개년)
- 위치 : 동두천시 상패동 산18번지 일원
- 면적 : 75,558㎡
- 사업비 : 6,220백만원 (국비 4,800, 특별조정교부금 1,000, 시비 420)

○ 목표

- 묘지 이전 및 상패근린공원조성 완료 : 2026. 7.까지

□ 현황 및 사업목표

○ 사업현황

시 설 명	총면적 (㎡)	기조성 (㎡)	향후조성 (㎡)
계	75,558	14,152	61,406
도로및광장	6,623	839	5,784
조경(잔디마당)	1,466	-	1,466
휴양시설(금속쉼터)	2,235	-	2,235
유희,운동,관리시설	5,305	4,997	308
편익 시설	4,208	2,013	2,195
녹지(수국원) 및 기타	55,721	6,303	49,418

□ 추진실적

- 2023. 2. : 분묘조사용역 완료
- 2023. 3. : 상패근린공원 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 4. : 재해영향평가 완료
- 2024. 7. : 무연분묘 개장용역 착수
- 2025. 6. : 공사 착공
- 2025.12. : 묘지이전 완료(유연 227기, 무연780기)


□ **향후 추진계획**

○ 2026. 7. : 공사 준공

□ **기대효과**

- 무분별하게 방치된 집단 묘지 이전으로 주변 정주 환경 개선
- 휴게시설이 부족한 상패동 지역 주민들에게 쾌적한 휴게공간 제공

□ **공원조성계획 조감도**

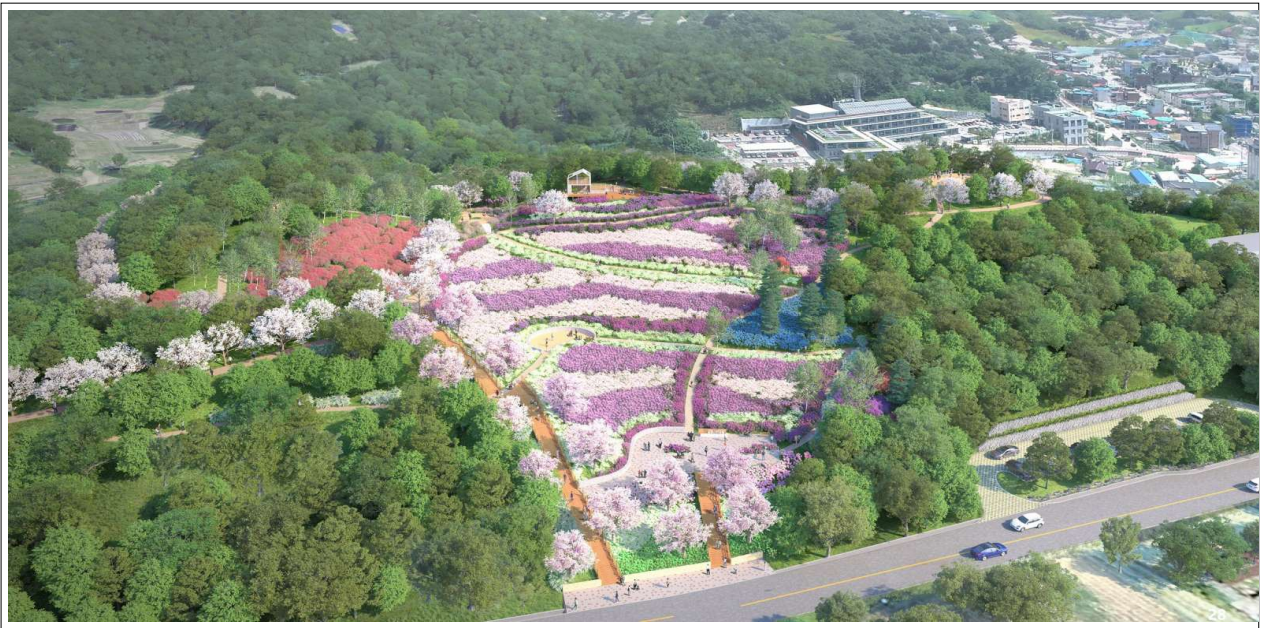

□ **민선8기 로드맵**

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업비 확보 및 실시설계 용역																					
묘지이전 추진																					
공원조성 추진																					

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

재원	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	10,220	4,000	761	1,663	3,796		
국비	4,800		341	1,663	2,796		
도비							
시비	4,420	4,000	420				
특조금	1,000				1,000		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2027년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	%			100				
묘지이전 완료	식					1		
공원조성	식						1	

7

반려동물 테마파크 조성 추진

※ 도지사 공약(176번) : 권역별 반려동물 테마파크 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 반려동물과 반려동물정책팀장 함태훈 ☎ 8030-4471

동두천시 공원녹지과 공원시설팀장 백수현 ☎ 2487, 담당자 홍성철 ☎ 2439

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8.~2028. 12.

○ 위 치 : 동두천시 상봉암동 산13번지 일원

○ 사 업 비 : 25,000백만 원(기금 1,900, 도비 7,500, 시비 15,600)

※ 현재 확보액 : 176억 원(기투자 7억, 공모사업 선정에 따른 150억(도비75, 시비75) 기금19억)

○ 사업내용 : 반려동물 테마파크 조성(부지면적 62,472㎡)

- 필수시설 : 반려동물 문화센터, 반려동물 입양센터, 반려동물 어질리티놀이터, 반려동물 산책로

- 연계시설 : 캠핑장, 카페, 야외공연장, 직업체험실 등

□ 추진실적

○ 2022. 11. ~ 2023. 7. : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 완료

○ 2023. 8. ~ 2024. 1. : 건축기획용역 완료

○ 2023. 10. : 경기도 투자심사 완료

○ 2024. 3. : 공공건축심의 완료

○ 2024. 9. : 북부권역 반려동물 테마파크 조성 공모사업 선정(도비 75억)

○ 2024. 11. : 2025년 지방소멸대응기금 반영 (기금10억)

○ 2025. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수(기반시설)

○ 2025. 3. : 주민설명회 추진

○ 2025. 3. : 제1차 중앙 지방재정 투자심사 반려(의존재원 변경에 따른 재심사)

- 반려사유 : 산출근거 및 사업규모 적정성 보완

○ 2025. 4. : 소요동 주민 동반 반려동물 장묘시설 벤치마킹 추진

○ 2025. 6. : 제2차 중앙 지방재정 투자심사 반려

- 반려사유 : 사업 필요성 및 객관적 산출근거 보완

○ 2025. 9. : 북부권역 반려동물 테마파크 기본계획 변경(동물장묘시설 장기 과제로 전환 등)

- 2025. 10. : 제2차 중앙 지방재정 투자심사 승인(조건부)
 - 조건사항: 설계완료 전 설계사항에 대한 2단계 심사를 득하여야 함.
- 2025. 12. : 건축 설계용역 계약심사 완료(경기도)

□ **문제점 및 대책**

- 대규모 사업비가 소요되는 사업으로 자체재원 최소화 및 보조 재원 확보 필요
 - '26년 행정안전부 지방소멸대응기금 9억원 추가 확보하였으나, 총사업비 중 공모 사업 매칭비 등을 제외한 시비 74억 원 미확보로 추가 보조재원 확보 방안 검토 중
- 대상지 경사도가 매우 높고 험준하여 시설 배치를 위한 가용부지 부족
 - 최적의 시설 구성 도출 및 필요 면적 산정 후 체육공원 부지(2025.12.19. 소유권 확보) 추가 활용 검토

□ **추진계획**

- 2025. 12. ~ 2026. 2.: 건축설계공모 추진
- 2025. 1. ~ 2027. 3. : 기반시설 및 건축분야 기본 및 실시설계 준공
- 2027. 4. ~ 2028. 12.: 반려동물 테마파크 공사 추진

□ **기대효과**

- 반려동물 대회 및 축제, 펫시터 서비스, 반려동물 캠핑장 등 다양한 부가 가치를 창출하여 지역경제 활성화 기여
- 반려동물 양육 가구 증가에 따른 관련 서비스 수요 충족

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진 사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026				2027				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	■																						
건축기획 용역 및 투자심사			■																				
투자심사(중앙) 실시 및 인허가											■												
공사추진																			■				2028. 준공

○ 소요예산액 : 25,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	25,000		100	50	600	1,600	22,650	
시비	15,600		100	50	600	300	14,550	
도비	7,500					300	7,200	
기타	1,900					1,000	900	지방소멸 대응기금

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	식	준공	착수	준공				
실시계획 수립	식	준공				착수		준공
공사착수	식	업체 공고						업체 공고

8 신천 친수공간 조성(1)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉞	중기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 한재민 ☎ 2335

□ 사업개요

○ 신천 친수공간 시민 환원 사업

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 상패동 309번지(선업교 인근 포장마차촌)
- 총사업비 : 1,051백만원(국비 195, 시비 856)
- 사업내용 : 제방정비(식생매트 설치 등 L=110m), 지장물철거(조립식 판넬 12동)
- 사업목적
 - 양주시 은현면과 동두천시 상패동 경계 선업교 좌안에 20년 이상 불법시설물(조립식 판넬 12동)로 인해 도시미관 훼손 및 주민의 친수공간 이용 불편, 교통흐름의 불량(2차선)으로 주민불편이 가중되고 있어
 - 신천 선업교 좌안 불법 지장물을 철거한 후, 기존 2차선을 3차선으로 확장하고 호안정비와 자전거도로 등을 재설치하여 친수공간을 시민에게 환원하고자 함

□ 추진실적

- 2022. 5. 26. 설계 완료
- 2022. 9. 7. 사업인정에 관한 의견청취 완료(총12가구, 실거주확인 5가구)
- 2023. 1. 20. 하천공사 실시계획 인가 승인(한강청→시)
- 2023. 3. 6. ~ 4. 14. 하천공사 시행계획 및 보상계획 공고
- 2023. 4. 12. 선업교 포장마차촌 이해관계자 면담
- 2023. 5. 16. ~ 소유권 등 증빙자료 징구(15가구 전원 제출)
- 2023. 6. 28. 변호사 자문(소유권 증빙자료의 적정성 등)
- 2023. 11. 30. 손실보상협의 요청(1차)
- 2023. 12. 12. 신천 선업교 옆 호안정비공사 착공 (12. 20. 공사중지)
- 2024. 3. 29. 지장물 6개동 부분철거 완료(일체형 건물이라 부분 철거)
- 2024. 5. 16. 지장물 보상 완료
- 2024. 7. 12. 소유주 및 세입자 이전, 수도·전기 폐전 완료

- 2024. 8. 5. 지장물 전체 철거 및 폐기물처리 완료
- 2024. 8. 13. 신천 선업교 옆 호안정비공사 재착공
- 2024. 9. 9. 공사 준공

□ 위치도 및 현장전경



□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,051		856	195				
시비	856		856					
국비	195			195				

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
실시설계용역	%	10	10					
주거자 이주	%	40		2	38			
철거 및 공사	%	50			50			

8-1 신천 친수공간 조성(2)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉞	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

한강유역환경청 하천계획과장 이종원 ☎ 790-2520, 팀장 박현정, 서명훈 ☎ 790-2520, 2521
 안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 한재민 ☎ 2335

□ 사업개요

- 사업위치 : 신천 내(송천교~상패교)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 2,597백만원(국비 2,000 시비 597)
- 사업내용 : 신천 변에 체육·문화 공원 조성

□ 추진실적

- 2023. 8. 2024년 특수상황지역개발(접경) 신규사업 선정
- 2023. 11. 용역과제 심의 완료(기본 및 실시설계용역)
- 2024. 3. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 8. 소규모 환경영향평가용역 착수
- 2025. 1. 소규모 환경영향평가 협의 신청(한강유역청)
- 2025. 3. 소규모 환경영향평가 협의 완료(한강유역청)
- 2025. 4. 하천점용허가 신청(한강유역청)
- 2025. 9. 하천점용허가 재신청(한강유역청)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 공사 시행 전 환경부(한강유역환경청) 인허가 검토 지연
 - 하천점용허가 신청(4.1.)▶반려(8.12, 4개월 이상 소요)▶재신청(9.26.)
 - ※ (주요원인) 한강청 점용허가 담당자 4회, 팀장 1회 변경으로 업무 연속성 결여 등 극심한 차질 발생, 재신청 이후 현재까지도 검토 지연 중
 - 금년 2월~11월까지 한강청 총 4회 방문 및 수심 차례 유선으로 촉구

- (대책) 점용허가 회신 지속 촉구 및 허가 시 공사 발주
 - 인허가 완료 단계에 맞춰 설계용역 준공, 계약심사 등 공사 발주

□ **향후 추진계획**

- 2025. 12. 하천점용허가 승인(한강유역청)
- 2026. 2. 공사 발주 및 착공
- 2026. 12. 공사 준공


□ **기대효과**

- 유희공간 등을 친수공간으로 조성함으로써 다양한 여가활동 공간 제공

□ **사업대상지**



□ **기본구상(안)**

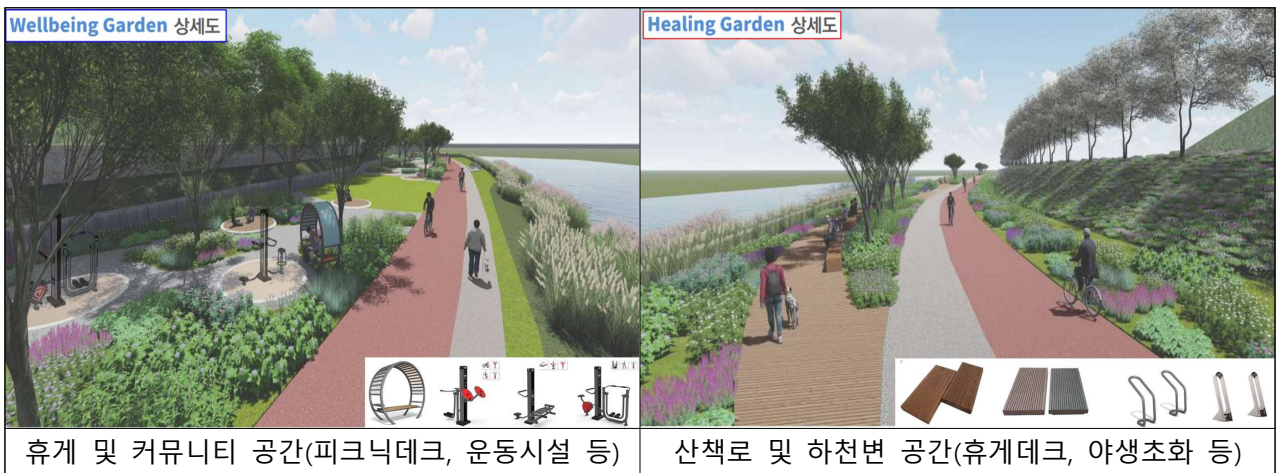

휴게 및 커뮤니티 공간(피크닉데크, 운동시설 등)

산책로 및 하천변 공간(휴게데크, 야생초화 등)

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역					[Blacked out]																
행정절차(인허가 등)																					한강청
공사 추진																					

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
국비	2,000				100	1,900		
시비	597			60	236	301		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
설계 용역	%	40	-	20	15	5		
공사 추진	%	60				30	30	

9

GTX-C 동두천 연장 추진

※ 도지사 공약(64번) : GTX A,B,C 연장 및 D,E,F 신설

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 철도정책과 GTX팀장 방건석 ☎ 8030-4821

동두천시 교통행정과 교통행정팀장 이상훈 ☎ 2294, 담당자 오주경 ☎ 2752

□ 사업개요

- 사업명 : GTX-C 노선 동두천 연장
- 사업구간 : 동두천~덕정(9.6km)
- 사업기간 : 2020. 11. ~ 개통 시까지
- 사업비용 : 약 827억 원(운영비 : 49억 원/년)

※GTX-C 노선 연장 타당성 검증 용역 기준

○ 사업내용

- 현재 추진 중인 GTX-C 노선을 경기도 북부권으로 연장하여 동두천시로 유치하는 사업 → 기존 : 덕정~수원 / 변경 : 동두천~수원

□ 추진현황

- 지난 2024년 1월 25일 민생토론회 및 GTX-C 노선 착공식에서 GTX-C 동두천 연장 계획 확정 발표
- GTX-C 노선 연장 관련 지자체 및 기관 위수탁 협약 추진 중
 - 관련 지자체 : 동두천, 화성, 오산, 평택, 천안, 아산시
 - 관련 기관 : 국토교통부, 국가철도공단, 한국철도공사, 사업시행자(현대건설 컨소시엄)
- GTX-C 노선 연장 관련 지방재정투자심사 제출 자료 용역 수행
 - 용역명 : GTX-C 노선 연장 지방재정투자사업 타당성 조사
 - 용역기간 : 2024. 8. ~ 2025. 12. (용역 기간 연장)
 - 주관 : GTX-C 노선 연장 관련 지자체 → 천안시 대표 수행
 - 내용 : 투자사업의 필요성 및 타당성 검토(소요자금조달 여부 등)
- 동두천시 철도건설기금 지속 적립(총목표액 827억 원)
 - 2025년 100억 원 적립(총 적립금액 300억 원)

□ **추진실적**

- GTX 2기 청사진에 GTX-C 동두천 연장 계획 확정(GTX-C 착공식)
 - 국토교통부 및 관련 지자체 간 GTX-C 노선 연장 상생 협약 체결
 - 관련 지자체 : 경기도, 충청남도, 동두천, 화성, 오산, 평택, 천안, 아산
 - GTX-C 노선 연장 관련 타당성 검증 용역 분석 결과
 - 검증 용역 결과 선정된 노선 타당성 확보 → B/C=1.02
 - 동두천시 부담 비용은 사업비 약 827억 원, 운영비 약 49억 원/년으로 산정
 - GTX-C 노선 연장 관련 지방재정투자사업 타당성 조사 용역 분석 결과
 - 분석 결과 선정된 노선 타당성 미확보 → B/C=0.90
- ※ 본 사업의 경우 원인자 부담에 따른 별도의 예비타당성 조사를 수행하지 않으며, 기존 사례에서도 B/C=0.9 수준의 사업은 차질없이 사업이 대부분 추진

구분	전체			수도권			비수도권		
	B/C	AHP	통과율	B/C	AHP	통과율	B/C	AHP	통과율
2023년	0.85	0.560	80%	0.94	0.574	100.0%	0.83	0.557	75.0%

자료 : 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)

- 동두천시 부담 비용은 사업비 약 844억 원, 운영비 약 53억 원/년으로 산정

〈검증 용역 비교〉

구분	경제성(B/C)	사업비(건설비)	운영비
지방재정투자사업	0.90	844억원	53억원/년
타당성검증	1.02	827억원	49억원/년
증감	-0.12	+17억원	+4억원/년

□ **향후 추진계획**

- GTX-C 노선 연장 관련 위수탁 협약 체결
- GTX-C 노선 연장 승인 → 국토교통부
- GTX-C 노선 연장 관련 지방재정투자사업 심사 의뢰 → 행정안전부
- GTX-C 노선은 민간 주도 사업으로 선정된 민간사업자와 유기적인 관계를 유지하여 업무협약의 추진

○ GTX-C 동두천 연장 운영 방안 마련 용역 수행

- 국토교통부 및 사업시행자와 원활한 협의를 위한 세부적인 사업비 및 운영비 검토
→ 검증 용역에서 산정된 사업비 및 운영비 개선 방안 마련

※ 세부 검토 사항 : 현실적인 GTX-C 노선 이용자 수 산정과 이에 따른 우리 시 부담 운영비 산정 후 재정 투입 대비 효율성 검토

□ 민선 8기 로드맵

○ 추진 일정

- 2026. 상반기 : 지방재정투자사업 타당성 조사 준공 → 지방재정투자심사 의뢰
- 2026. 상반기 : GTX-C 노선 연장 관련 위수탁 협약 체결 추진
- 2026. 상반기 : GTX-C 노선 연장 승인 → 국토교통부
- 2026. 상반기 : GTX-C 동두천 연장 운영 방안 마련 용역 수행(사업시행자 협의 목적)

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
GTX-C 노선 연장 관련 검증용역 수행 (국가철도공단)					■	■	■	■	■	■	■	■					
GTX-C 동두천 연장 기술 검토 용역 수행													■	■	■		
지방재정투자사업 타당성 조사 (한국지방재정연구원)									■	■	■	■					
지방재정투자심사 의뢰													■	■			
GTX-C 노선 연장 승인													■	■			
사업시행자 선정 및 협의(착공)										■	■	■	■	■	■	■	■
관계기관 업무협의(상시)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 소요 예산액

- 연차별 소요 예산액은 『GTX-C 노선 연장 타당성 검증 용역』의 사업비 산정 결과 반영

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	82,690				2,922	79,770	
국비							
도비							
시비	82,690				2,922	79,770	
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표		단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
GTX-C 동두천 연장 확정	GTX-C 동두천 연장 승인 (국토교통부)	1	1				1		
	합계	1	1				1		

10 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉓	장기	임기후	국토부	신규	미추진	국비

도로과 도로건설팀장 강수룡 ☎ 2430, 담당자 박철희 ☎ 2429

□ 추진배경

- 동측으로는 구리~포천 간 고속도로는 개통 되었으나, 경기북부 북서쪽 남북 연결도로는 전무한 실정임
- 양주 신도시 건설 및 동두천 국가산업단지 유치 등 교통 수요 증가와 낙후된 경기북부 발전을 위해 조속한 사업추진 필요

□ 사업개요

- 사업명 : 서울~연천 고속도로(남북5축)
- 사업구간 : 제1순환고속도로(송추IC) ~ 연천
- 사업규모 : 고속도로 신설, L=50.7km
- 사업비 : 28,051억 원
- 사업기간 : '21~ '30년(서울~양주 구간 21.6km는 '26년 착공, '30년 개통 예정)

□ 추진경위 및 향후계획

- 2019. 3. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 관련 의견 제출
- 2022. 1. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 확정
 - (서울-연천 서울고속도로) 남북 간의 교류·협력 활성화 도모와 양주 신도시 개발 등 수도권 북부지역의 교통수요에 대응하기 위해 국토교통부 사업 추진 결정
 - ※ 제2차 고속도로 건설 계획 도로정책심의위 의결·확정 사항(2022. 1. 28.)
- 2023. 8. (1단계 사업) 서울-양주 고속도로 민간투자사업 제3차 제안공고 (국토교통부 공고 제2023-958호)
- 2023. 9. (1단계 사업) 서울-양주 고속도로 민간투자사업 제3차 제안 재공고 (국토교통부 공고 제2023-1114호)

- 2024. 1. 서울-양주 고속도로 민간투자사업 우선협상대상자(포스코이앤씨 컨소시엄) 선정(국토부 보도자료 게시)
- 2025. 5. 실시설계용역 및 환경영향평가용역 착수
- 2026년 하반기 실시설계용역 및 환경영향평가용역 완료(예정)
- 2027년 1월 공사 착공(예정)

□ 문제점 및 대책

- 동두천, 양주, 연천 관련부서 및 양 시군 국회의원과 함께 남북고속도로 추진 필요성을 관련부처에 적극 건의하여 최우선 사업 추진 필요

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	식	착공		제3자 제안공고	우선협상 대상자 선정	실시설계	착공	추진

11 GTX-C노선 연장에 따른 환승시설 도시계획 수립

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉔	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

도시재생과 도시계획팀장 강문성 ☎ 2355, 담당자 강민균 ☎ 2353

□ 추진배경

- GTX-C노선 연장에 대비하여 이용객의 환승활동과 주거·상업·업무 등 사회경제활동을 복합적으로 지원하기 위한 도시 개발 기틀 마련

□ 사업개요

- GTX-C노선 연장에 따른 환승센터(주차장), 공원 등 기반시설 설치 및 민간주도 주거·상업·업무 등 복합개발 지원
 - 위 치 : 동두천동 245-1번지 일원(동원연탄 일원)
 - 면 적 : 11,621㎡(환승센터 및 공원 중복결정)
 - 주변 현황
 - 일반상업지역(역세권지구단위계획구역)·제2종일반주거지역(舊 야구장)·자연녹지지역(동원연탄), 캠프 케이시, 동양대학교, 지방산업단지 등 입지

□ 추진실적

- 2025. 5. 도시계획시설[환승센터(주차장), 공원 등] 결정 용역 착수
- 2025. 8. 주민의견 청취를 위한 열람·공고
- 2025. 8. ~ 12. 관계기관 및 관련부서 협의(국방부 및 한국철도공사 등)

□ 추진방향

- GTX-C노선 연장에 따른 지원시설[환승센터(주차장), 공원 등] 확충
 - 동두천동 245-102번지(동원연탄) 일원에 신규 도시계획시설 결정을 통한 주차 및 환승활동 지원
- GTX역사 주변 주거·상업·업무시설 등 민간 복합개발사업 지원
 - 동두천동 245-1번지 일원 민자사업 추진 시 체계적인 개발 유도 및 행정적 지원 실시

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	90					90		
국비								
도비								
시비	90					90		
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
GTX-C노선 연장	식	확정			확정			
도시계획시설 결정 용역	식	완료				착수,완료		

청년 및 신혼부부를 위한 공공임대주택 건립

※도지사 공약(53번) : 청년·신혼부부 등 무주택자 20만호 공급

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 주택정책과 공공주택팀장 김영시 ☎ 8008-3235

동두천시 건축과 주택팀장 김혜정 ☎ 2395, 담당자 안예지 ☎ 2402

□ 사업개요

- 개념 : 모듈러주택 공법을 적용한 공공임대주택 및 가족센터를 복합 개발하여 주거 여건 개선 및 도시 경쟁력 확보
- 추진기간 : 2025.~2030.(6년간)
- 위치 : 지행동 722번지(송내 4주차장) * 역세권(지행역) 300m 이내 보도 5분
- 공급대상 : 청년 및 신혼부부 등 주거 취약계층
- 내용 : 공공임대주택(210세대), 가족센터, 근린생활시설

□ 추진실적

- 2023. 1. 9. 통합공공임대주택 서면 수요 조사 실시(市)
- 2023. 6. 26. 통합공공임대주택 건립사업 규모검토 용역 준공(市)
- 2023. 9. 11. 통합공공임대주택 관련 설문조사 실시(市)
- 2023. 10. 17. 통합공공임대주택 건립사업 사업성검토 용역 준공(GH)
- 2023. 11. 10. 회의 시 경기도형 복합개발사업 추진 의향 확보(GH)
- 2024. 6. 4. 도시관리계획 변경 수립 용역 계약 및 착수(市)
- 2024. 8. 27. 지행역 통합공공임대주택 복합개발사업 업무 협약 체결
- 2025. 4월 간 통합공공임대주택 건립 관련 설문조사 실시(1개월)
- 2025. 5. 27. 동두천 도시계획위원회(조건부 가결)
- 2025. 6. 9. 모듈러 연구용역 준공(GH)
- 2025. 7. 24. 도시관리계획 변경(안) 입안 요청(市→道)
- 2025. 8. 13. 국토부 특화형 공공임대주택 공모사업(지역제안형 특화주택) 선정
- 2025. 11. 14. 경기도 도시계획위원회(도시관리계획 변경)
- 2025. 12. 23. 동두천시 도시계획위원회(지구단위계획 변경)

□ **사업 필요성**

- 인구 감소 관심 지역인 동두천시는 인근 도시의 개발로 지속적인 청년층 인구 유출이 가속화되고 있음에 따라 교통이 편리하고 정주여건이 우수한 위치에 임대주택을 공급하여 주거비 부담 경감 및 주거 안정을 도모하여 인구 유출을 방지하고자 함
- 경기도에서는 이러한 필요성을 고려하여 본 사업을 경기 북부 대개조 프로젝트 (핵심사업 청년·신혼부부 공공임대주택 건립)에 포함하였으며 경기도 내 지역균형발전 및 균등 개발을 위하여 최대 210호의 임대주택 건립 필요

□ **추진계획**

- 2026. 국무회의 상정, 건축 설계 민간사업자 공모
 - ※ 행정절차 간소화(중앙투자심사 및 타당성 조사 생략)로 신속한 사업 추진 가능
- 2027. 하반기 주택사업계획승인 및 착공

□ **민선8기 로드맵**

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공청사 복합개발 공모	식	준공		후보지 선정	협약 체결	공모 선정	설계 공모	

13 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비
행정안전부 균형발전진흥과장 박유정 ☎ 044-205-3530, 균형발전담당관 성인재 ☎ 031-8030-2610 공공사업과 공공사업과장 함종훈 ☎ 2581, 담당자 공공개발팀장 강민수 ☎ 2582						

□ 사업개요

- 사업명 : 왕방계곡 숲길(트레일)조성사업(산림복지단지 연계)
- 기간 : 2024. 1.~2026. 12.
- 위치 : 왕방계곡 ~ 산림복지단지 (탑동교 ~ 자연휴양림)
- 사업비 : 11,500백만 원(국비 9,200, 시비 2,300)
 - 왕방계곡 숲길(트레일)조성 : 7,500백만 원(국비 6,000, 시비 1,500)
 - 왕방계곡~산림복지단지 연계 산책로드 조성 : 4,000백만 원(국비 3,200, 시비 800)
- 사업내용 : 숲길 조성(숲길 약 5.6km, 거점 쉼터 6개소, 보행교 1개소 등)

□ 추진실적

- 2023. 4. : 2024년 특수상황지역 개발 신규사업 신청(1구간)
- 2023. 8. : 2024년 특수상황지역 개발사업 대상 확정(1구간)
- 2024. 1. : 사업이관(공원녹지과→투자개발과)
- 2024. 4. : 2025년 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청(2구간)
- 2024. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 7. : 착수보고회 개최
- 2024. 8. : 의원정담회(착수보고) 및 계획노선(안) 현장실사
- 2024. 9. : 2025년 특수상황지역 개발사업 대상 확정(2구간)
- 2024. 11. : 중간보고회 및 의원정담회(중간보고) 완료
- 2025. 3. : 최종보고회 및 의원정담회(최종보고) 완료
- 2025. 4. : 1구간 설계 완료
- 2025. 6. : 사유지 보상 완료 (8필지, 24,307㎡)
- 2025. 9. : 시공사 선정 및 공사 착공

14 노인 및 장애인회관 건립

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진완료	시비

동두천시 공공사업과 건축시설팀장 김재상 ☎ 2595, 담당자 최민석 ☎ 2597

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7.~2025. 11.
- 위 치 : 동두천시 생연동 511-1번지 일원
- 총사업비 : 21,329백만 원(시비 21,329)
- 사업내용 : 노인회관 및 장애인회관 건립(부지면적 3,980㎡, 지상3층 2동)
 - 노인회관 : 연면적 1,335㎡, 장애인회관 : 연면적 1,431㎡

□ 추진실적

- 2022. 7. : 노인회관 및 장애인회관 건립계획 수립
- 2022. 8. : 지방재정 투자심사, 중기지방재정계획 반영
- 2023. 1. : 부지 매입 및 소유권 이전 완료
- 2023. 3. : 건축기획 용역 발주
- 2023. 6. : 건축기획 용역 준공 및 공공건축사업계획서 사전검토
- 2023. 7. : 공공건축심의 완료
- 2023. 8. : 계약심사 및 설계공모 세부 추진계획 수립
- 2023. 9. : 건축 설계공모 공고
- 2023. 10. : 설계공모 평가심사위원회 개최 및 설계자 확정
- 2023. 11. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수보고회, 노인회·장애인회 의견수렴
- 2024. 1. : 의원정담회(착수 보고)
- 2024. 5. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2024. 8. : 공사 착공
- 2025. 11. : 공사 준공

□ 기대효과

- 노인인구 및 장애인복지 수요 증가에 따른 관련 서비스 수요 충족

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 토지매입	■	■	■												
건축기획 용역 및 건축설계공모				■	■	■									
기본 및 실시설계						■	■	■							
공사									■	■	■	■	■	■	

- 소요예산액 : 약 21,329백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	21,329			5,428	6,117	9,784		
국비								
지방비	21,329			5,428	6,117	9,784		

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 및 설계공모	식	준공	착수	준공				
기본 및 실시설계 완료	식	준공		착수	준공			
공사완료	식	준공			착공	준공		

완료사업 서면보고 자료(29건)

1 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉞	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체

기획감사담당관 기획팀장 조철호 ☎ 2054, 담당자 김태구 ☎ 2145

□ 사업개요

- 용역명 : 동두천시 범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인 수립
- 용역기간 : 2023. 3. 20.~11. 28.(▲ 73일)
 - 당초 : 2023. 3. 20.~9. 15.
- ※ 본 용역 내 시범사업 실제 사례제시(도시재생지원센터 사업과의 연계)로 실무자 이해도 향상 및 원활한 사업실행 기반 구축을 위해 해당 사업의 일정을 고려하여 2023. 7. 28. ~ 10. 9.까지 용역 중지 후 재개하였음.
- 내 용 : CPTED 기본계획 수립 및 가이드라인 개발, 시범사업 제안
- 선정방법 : 협상에 의한 계약

□ 추진경과

- 2023. 3. 20. : 계약체결 및 용역착수
- 2023. 4. 10. : 착수보고회 개최
- 2023. 5. 9. : 유관기관(동두천 경찰서) 협의
- 2023. 6. 13. : 자문위원회 구성 및 개최
- 2023. 7. 4. : 방범기동순찰연합대 지대장 회의 시 의견수렴
- 2023. 7. 21. : 도시재생지원센터 사업 담당자 협의
- 2023. 7. 28. : 용역 중지
- 2023. 10. 10. : 용역 재개
- 2023. 10. 30. : 중간보고회 개최
- 2023. 11. 1. : 공공디자인 진흥위원회 심의
- 2023. 11. 13. : 최종보고회 개최
- 2023. 11. 28. : 용역 완료
- 2023. 12. 7. : 「동두천시 범죄예방 도시환경디자인(CPTED) 기본계획 및 가이드라인」 수립 및 배포(시청 홈페이지 게시 등)

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계약체결 및 용역착수	■																
세부전략 계획 및 가이드라인 개발	■	■															
용역 완료	■	■	■	■													

○ 소요예산 : 58백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	58			58				
국비								
도비								
시비	58			58				
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인	식	1		1				

2 **공정한 인사정책 시행**

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-44	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

자치행정과 인사팀장 김현철 ☎ 2126, 담당자 김성진 ☎ 2122

□ **사업개요**

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
- 전보 기준 구체화
- 평가 및 조직진단 활성화
- 상시적인 소통채널 강화

□ **추진계획**

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
 - 2022년도 인사 운영계획에 새로운 인사방향 수정·보완
 - 근무성적평정을 국 단위로 개선, 다양한 평가 반영 및 포괄적인 평정 시행
 - 공직 경쟁력 강화를 위하여 성과우수 및 소극행정을 근무성적평정에 적극 반영
 - 성과 중심의 가산점 분야를 확대하고 가점의 현실화
 - ※ 승진대상 직렬은, 직렬별 인원비율, 평균 승진소요연수, 퇴직자 직렬, 직렬별 1순위자의 현직급·최초임용일 등 고려하여 선정
- 전보 기준 구체화
 - 근무기간, 전문성, 보직경로 등 고려, 인력 적재적소 배치
 - 부서 간 진입장벽 해소 및 합리적 보직 부여를 위한, 본청·외청 및 선호부서·기피 부서 간 순환보직 실시
 - 기피부서 근무자 및 3년 이상 장기근무자 의무전보제 운영
- 평가 및 조직진단 활성화
 - 전년도 근무성적평정을 100% 연동하는 기존 성과상여금 제도의 개선방안 강구
 - 실적우수자 인센티브 강화
 - 적극행정 우수공무원 선발 확대
 - 외부 전문기관의 직무분석 및 조직진단 실시, 팀 분할·통폐합·증감원에 반영, 조직 유연성 확보 및 행정환경 변화에 전략적 대응

○ 상시적인 소통채널 강화

- 공무원노조의 인사제도 개선안 청취 (실무협의체 구성)
- 인사제도 개선사항에 대한 상시 설문조사 운영

□ 추진실적

○ 공정하고 합리적인 인사운영

- 국단위(4개 평정단위) 근무성적평정 실시로, 국별 특성에 따른 합리적인 평정
- 성과 중심의 가산점 재편, 가산점 항목 및 점수 확대
- 업무증대, 휴직 등에 대하여, 신속한 인력보충으로, 부서 업무공백 최소화
- 희망보직을 존중하면서, 업무특성, 업무처리능력, 부서간 순환보직, 인사운영상황 등을 고려한 전보

○ 조직진단 및 소통채널 강화

- 조직진단 전문기관의 진단결과를 신속하게 반영하여, 행정환경에 대한 신속하고 전략적인 대응
- 격무기피부서 재지정을 위한 설문조사지를 활용하여 전직원 의견 수렴

□ 문제점 및 대책

○ 3년 이상 장기근무자 의무전보

- 직렬특성 상 순환보직 제한되는 직렬에 대하여는 새로운 보직경로(분야) 발굴

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
조직진단 등	식	1	1					

3 동두천시 시설관리공단 설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-㉔	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체

자치행정과 공단TF팀장 김태우 ☎ 2390, 담당자 김의정 ☎ 2391

□ 사업개요

○ 설립목적

- 민간 경영기법 도입과 적정 예산운영을 통한 공공서비스의 질 극대화
- 늘어나는 시민의 공공서비스 수요에 합리적으로 대응

○ 설립근거 : 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 시행령 제47조

○ 소요예산 : 2,818백만 원

- 출자금: 200백만 원
- 시스템 구축: 337백만 원
- 통신공사 및 집기(가구, 컴퓨터, 모니터) 구입: 282백만 원
- 사업 위탁 진출금: 1,949백만 원
- 2차 사업 타당성 검토 및 조직 컨설팅 용역: 50백만 원

○ 추진기간 : 2022. 7.~2024. 9.

□ 대상사업(안) : 5개 분야 7개 사업

분야별	대상 사업	비고
교통사업(1)	공영주차장(11개소)	
관광시설(1)	산림휴양시설(자연휴양림, 놀자숲, 소요 별&숲 테마파크, 림스파, 어울림)	
생활지원(3)	안흥동 공설묘지, 쓰레기종량제봉투 제작·판매, 옥외광고물 게시대 관리	
상가관리(1)	두드림패션센터	
공공시설관리(1)	시민회관(청소년문화회관 수영장 포함)	

□ **추진실적**

- 2022. 7. 1. : 공단 설립 기본계획 수립
- 2022. 8. 2. : 의원정담회 개최
- 2022. 8. 9. : 경기도 제1차 협의 완료
- 2022. 10. 14. : 시설관리공단 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 6. 28. : 설립 타당성 검토 용역 완료
- 2023. 8. 10. : 주민공청회 개최(대회의실)
- 2023. 10. 27. : 경기도 제2차 협의 요청(협의 결과 : 적정)
- 2023. 11. 2. : 설립심의위원회 심의 완료
- 2023. 11. 3. : 공단 설립 결정
- 2023. 12. 31. : 조례제정
- 2024. 6. 14. : 임원(이사장, 비상임이사, 비상임감사) 임명
- 2024. 6. 19. : 법인 설립 등기
- 2024. 8. 12. : 직원 임용(경영지원팀 7명)
- 2024. 8. 30. : 이관 사업 위·수탁 계약 체결
- 2024. 9. 1. : 공단 출범
- 2024. 9. 2. : 직원 임용(관광운영팀 10명, 시설관리팀 8명)
- 2024. 9. 2.~10. 31. : 업무 인계·인수(합동 근무)

□ **민선8기 로드맵**

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	2,818				2,818			
국비								
도비								
시비	2,818				2,818			
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
시설관리공단 설립	개소	1			1			

4 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑧	중기	임기내	동두천시	신규	완료	국·시비

정보통신과 정보통신팀장 김경환 ☎ 2264, 담당자 고현국 ☎ 2303


□ 사업개요

- 메타버스 기술을 활용한 체험형 서비스를 시민들에게 제공
- 스마트빌리지 보급 및 확산 사업과 연계하여 메타버스 구축 추진

□ 추진결과

- 관내 지역아동센터 및 노인복지관을 이용하는 아동과 노인들에게 즐길거리를 제공하여 건강복지 실현
 - 아동 대상(아동복지시설, 청소년수련관) : 가상현실 스포츠 시설
 - 노인 대상(노인복지관) : 메타버스 체험관
 - 전체 수량

구분	가상현실 스포츠	메타버스 운동기구	화상회의 시스템	화상회의 스튜디오	교육용 키오스크	비고
아동복지시설	11	7				
청소년수련관	2	2				
노인복지관	1	2	1	1	2	

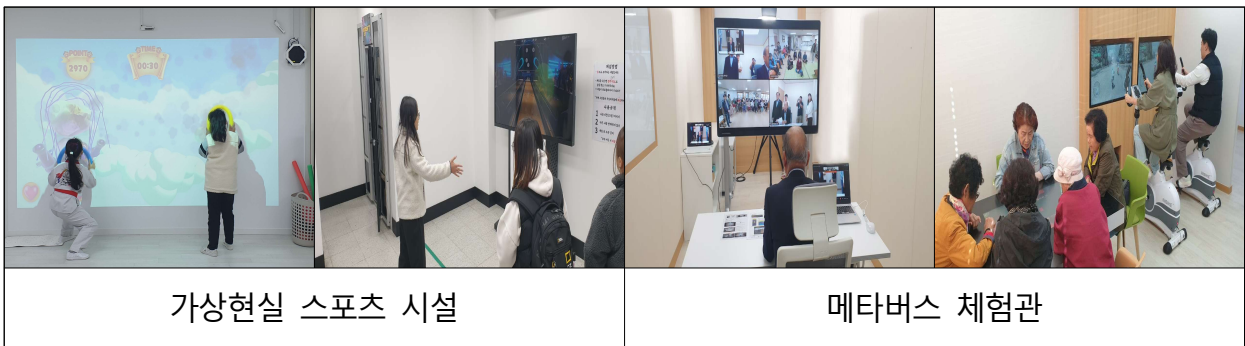

가상현실 스포츠 시설

메타버스 체험관

□ 추진실적

- 『디지털 시정운영 시스템(메타버스) 추진계획』 결재 완료(2022. 11. 29.)
- 2023. 2. ~ 6. : 계약 사전 절차 진행
- 2023. 6. 7. : 사업 계약 및 착수
- 2023. 8. 8. : 사업 설명회 개최(아동복지시설 및 노인복지시설 관계자)
- 2023. 10. 6. : 노인복지관(메타버스 체험관) 설치 완료
- 2023. 11. 3. : 청소년수련관 및 아동복지시설(가상스포츠 체험시설) 설치 완료
- 2023. 12. : 사업 준공 및 서비스 운영

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액
 - 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 추진 시 도입되는 시설 일부를 메타버스 체험형 서비스로 구축
 - 예산총액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,760		1,760				
국비	1,408		1,408				
도비							
시비	352		352				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
가상현실 스포츠시설 조성	개소	11		11				
메타버스 체험관 조성	개소	1		1				

5 디지털 플랫폼 교육센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-㉠	중기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

정보통신과 정보보호팀장 유진만 ☎ 2084, 담당자 연민식 ☎ 2081

□ 사업개요

- 정보화 교육 시스템 구축으로 다양한 교육 제공 및 정보화 능력 제고

□ 추진계획

- 공무원 정보화 교육
 - 초급과정 교육 : 자체 강의 및 온라인 교육 안내, 한글, 엑셀, SNS 사용 등 기초 교육
 - 중급과정 교육 : 전문적인 분야는 교육담당 부서에서 실시하는 교육기관교육 의뢰, 평생교육원 협조로 단기 강좌 개설
 - 인적자원개발시스템을 이용한 온라인 교육 실시
- 시민 정보화 교육
 - 평생교육원 및 청소년수련관 정보화 교육, 디지털 배움터
 - 경기도 평생학습 포털(GSEEK)활용(온라인)

□ 추진실적

- 공무원 정보화 교육
 - 일 시 : 2023. 5. 25.(목) 16:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 제2별관 2층 재난안전상황실
 - 내 용 : 최신 IT 정보 및 정보보안 관련 교육
 - 교육인원 : 교육참석자 13명
- 시민 정보화 교육
 - 집합교육
 - 평생교육원 시민 정보화 교육 : 엑셀·파워포인트, 포토샵 등 정보화 교육
 - ※ 2023년 1기 : 9개 강좌 126명 수료 / 2023년 2기 : 10개 강좌 132명 수료
2023년 3기 : 8개 강좌 124명 수료 / 2024년 1기 : 5개 강좌 80명 수료
 - 디지털 배움터 교육 : 컴퓨터 기초교육(비대면 교육 병행)
 - ※ 2023년 12월 기준 : 101개 과정 386명 수료
 - 온라인 교육
 - 경기도 평생학습 포털(GEEK) IT 교육 : 스마트기기활용, 프로그래밍 등 다양한 정보화 기술 교육 제공
 - ※ 현재 IT 교육 7개 분야 204개 강좌 개설 운영중

□ **문제점 및 대책**

- 본청 내 정보화 교육장 공간 부족
 - 평생교육원 정보화 교육장을 활용하여 공무원 및 시민 교육 가능
- 자체 강의를 위한 강사 부족
 - 강사(직원) 인센티브 부여로 강사 확보하여 다양한 자체 교육 실시 가능

□ **향후 추진계획**

- 시민 정보화교육(집합, 온라인) 지속 추진
- 공무원 정보화교육은 정보화 전문기관 교육으로 대체

□ **기대효과**

- 맞춤형 정보화 교육과 최신 IT기술 습득 기회 제공을 통한 업무 경쟁력 및 전문성 강화
- 창의적이고 경쟁력 있는 정보화 능력 향상을 통한 대국민 행정 서비스 제고

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
년도별 교육 수요조사	■				■				■				■				
정보화 교육 실시		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
교육실시 횟수	회	13	-	3	4	4	2	

6 지능형 CCTV 확충 및 우리에 맞는 시스템 강화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

정보통신과 영상정보팀장 오용환 ☎ 2833, 담당자 최금열 ☎ 2831

□ 사업개요

- 사업명 : 지능형(AI) CCTV 확대 설치사업
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 소요예산 : 5,237백만원
- 사업내용
 - 지능형 CCTV는 AI 카메라 및 분석서버를 통해 시스템이 조성되므로 노후된 카메라의 단계적 교체가 필요함

□ 추진방향

- AI(인공지능) 카메라를 활용하여 노인 실종 시 수색 용이한 시스템 구축
- 범인 검거를 위한 안면 및 차량, 차량번호 인식 지능형 시스템 구축
- 축제·행사에 대한 수용인원 초과 등 다중밀집지역에 선제적 계도방송 전파

□ 추진현황

- 2022년 : 기존 지능형CCTV 시범운영(AI 카메라 및 서버)
- 2023년 : AI 서버 4식, 신규 10개소(41대), 노후카메라 교체 134대 등
 - 총 1,300백만원 확보(특조금 800백만원 및 시비 500백만원)
- 2024년 : AI 서버 3식, 신규 40개소(174대), 노후카메라 교체 274대 등
 - 총 2,332백만원 확보(특조금 1,200백만원, 특교세 800백만원, 시비 220백만원, 도비보조 90백만원, 주민참여예산 22백만원)
- 2025년 : 신규 19개소(84대), 노후카메라 교체 348대 등
 - 총 1,005백만원 확보(특교세 400백만원, 도비보조 90백만원, 시비 493백만원, 주민참여예산 22백만원)
- 2026년 ~ : 매년 600~900백만원 예산 필요

□ **문제점 및 대책**

- 노후된 카메라를 AI카메라로 교체 및 지능형서버 등 시스템 도입 시, 사업예산 증가
 - 특교세, 특별조정교부금, 도비매칭사업 등 적극적인 예산신청으로 예산확보

□ **향후 추진계획**

- 지속적인 국도비 신청으로 자체예산 외 추가예산 확보 노력

□ **기대효과**

- 인공지능형 카메라를 활용한 안면인식 서비스를 통해 범죄 수배자 검거 및 실종자 발생 시 수색에 활용하여 시민의 안전에 기여
- 지능형 CCTV 시스템 확충을 통한 치안 사각지대 해소 및 범죄심리 사전 억제 등 안전한 도시환경 구축

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지능형 CCTV 시스템 구축사업	■	■			■	■			■	■			■	■			

- 소요예산 : 5,237백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	이후	
계	5,237	1,300	2,332	1,005	600	매년 600	
국비	1,200		800	400			
도비	54		27	27			
시비	1,983	500	305	578	600	매년 600	국비,도비건의
기타 (특조금)	2,000	800	1,200				

※ 지능형서버 1식에 AI카메라 100대 수용가능 / 2031년 지능형(AI) CCTV 시스템 100% 구축완료 예정

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					비고
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
인공지능형 카메라 설치 및 교체	대수	1,330	132	192	486	284	236	

※ 동두천시 지능형(AI) CCTV 우수사례 : 타 지자체 수원시 등 6개 시군 견학 및 벤치마킹

7 지역아동센터 이용 확대추진 및 프로그램 다양화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-①	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

사회복지과 아동복지팀장 김순희 ☎ 2805, 담당자 장정원 ☎ 2206

□ 사업개요

- 지역아동센터 이용 학생 확대 추진 : 기 시행
 - 중위 소득 80%까지 이용 대상 확대
- 지역 사회와 연계한 프로그램의 다양화

□ 추진계획

- 지역아동센터 이용 확대 : 소득 상관없이 입소 가능
 - 연령기준 : 만 18세 미만의 아동
 - 소득기준 : 소득기준 없이 이용 가능
- 프로그램의 다양화 계획
 - 지역아동센터 이용아동의 차별성과 다양한 수요를 충족시켜주기위해 각 센터별 보조금 교부하여 지역연계 프로그램 운영 활성화를 도모
 - 장애·다문화 등 특성별 지역아동센터 특화프로그램 추가 제공(동안아동센터 등 5개소)

□ 추진실적 및 향후계획

- 2025. 2.~3. : 지역아동센터 14개소 보조금 신청 및 추진계획서 접수
- 2025. 4. : 지역아동센터 연간 프로그램 계획에 따른 보조금 지급
- 2025. 4.~12. : 지역아동센터 프로그램 운영
- 2026. 1. 한 : 보조금 정산 등

□ 기대효과

- 지역아동센터를 이용하는 아동들에게 다양한 프로그램을 제공하여 공동체 속에서 더불어 살아갈 수 있는 바른 가치관 확립
- 지역아동센터 이용아동에게 다양한 프로그램을 지원하여 자존감을 향상시키고 자기개발과 잠재된 능력을 발굴시킬 수 있는 기회 제공
- 장애·다문화가정 등의 아동에게 정서적, 문화적으로 다양한 특화프로그램을 제공하여 또래 아동들과 조화롭게 성장할 수 있도록 도움

[붙임] 지역아동센터별 운영 프로그램

연번	시설명	대표(시설장)	지역연계 프로그램	특성별 지역아동 프로그램
1	푸 른 샘	송재산(서유선)	<ul style="list-style-type: none"> • 보산동 향기공방 체험 • 제과제빵 원데이 특가 • 도마만들기 공방체험 	
2	동 안	장만근(김경자)	<ul style="list-style-type: none"> • 롤링킹 • 놀자숲 익스트림 	<ul style="list-style-type: none"> • 한글교실(독서인지치료교실)
3	아이들웃음터	한완수	<ul style="list-style-type: none"> • 캠핑체험(1박2일) 	
4	드 림	박찬규(박상희)	<ul style="list-style-type: none"> • 앓은반 사물놀이 	<ul style="list-style-type: none"> • 체육활동 지원
5	생 연	이경희	<ul style="list-style-type: none"> • 앓은반 사물놀이 	
6	행복꿈터	박선영	<ul style="list-style-type: none"> • 놀자숲 체험 • CGV 영화관람 	<ul style="list-style-type: none"> • 달란트시장 운영
7	사랑나무	정근재(정은희)	<ul style="list-style-type: none"> • 캠핑 체험 	
8	보 산	김명숙	<ul style="list-style-type: none"> • 계곡체험 • 전시관람 • 문화체험(영화관람) 	<ul style="list-style-type: none"> • 한글 기초교육 • 문화프로그램(영화관람, 체험학습)
9	꿈 틀	김성윤	<ul style="list-style-type: none"> • 체육활동 • 특기적성교육(한자교육) • 문화체험(별안숲캠핑, 영화관람) 	
10	해 맑 음	김승하(최금숙)	<ul style="list-style-type: none"> • 도자체험 	
11	에 이 스	김장수(김용호)	<ul style="list-style-type: none"> • 토탈공예 프로그램 	
12	지 행	박순자(김현숙)	<ul style="list-style-type: none"> • 놀자숲 문화체험 	
13	두 레	송순화	<ul style="list-style-type: none"> • 사물놀이 체험활동 	<ul style="list-style-type: none"> • 한국어 교실 • 다문화가정 논술 교실
14	우 성	최용화	<ul style="list-style-type: none"> • 도자기 공방체험 	

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화																	

○ 소요예산액(지연연계프로그램)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	131	20	30	27	27	27	
국비							
도비							
시비	131	20	30	27	27	27	
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역연계 프로그램 운영 수	개	63	3	15	13	14	7	8

8

영·유아 보육시설 교구, 교재 지원

※ 도지사 공약(146번) : 영유아 교재·교구 보급 및 놀이 코칭 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
I-②	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

경기도 보육정책과 보육정책팀장 김덕선 ☎ 8008-2370
 동두천시 여성청소년과 보육팀장 최민희 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

□ 사업개요

- 어린이집에 교재교구비를 지원하여 보육 환경 및 서비스 질 향상
- 국비로 교재교구비 사업이 기지원되고 있으나, 지원 조건을 충족하지 못해 혜택을 받지 못하는 어린이집과 기존 대상 어린이집에 시비로 교재교구비 확대 지원
- 지원 대상 및 내용

사업 분류		현 행(2022)	변 동(2024)
기존 국비 사업		지원 조건 충족 어린이집만 현원별 40만원~100만원 지급	지원 기준 시점에 설치 운영 중인 어린이집 중 교재교구비가 필요한 어린이집
신규 시비 사업	기존 국비 대상 어린이집	-	
	국비 대상 아닌 어린이집	-	

- 지원 대상 및 지급시기: 관내 모든 어린이집, 연 1회(7월 중)

□ 추진실적

- 2022. 9월: 추진계획 수립
- 2022. 12월: 2023년 본예산 반영
- 2023. 7월: 교재교구비 관내 어린이집 66개소 지급 완료
- 2023. 12월: 2024년 본예산 반영
- 2024. 7월: 교재교구비 관내 어린이집 57개소 지급 완료

□ 기대효과

- 국비 지원 어린이집과 국비 미지원 어린이집 간의 보육 격차 해소
- 공평한 교재교구비 지원으로 전반적인 관내 아동 보육의 질 향상

□ 민선8기 로드맵

- 예산총액 : 54백만원
 - (국비 사업) 지원 평균액 500천원 * 약64개소 * 1회 = 32백만원
 - (시비 사업) 지원 평균액 340천원 * 약64개소 * 1회 = 22백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	284	30	34	58	54	54	54	
국비	118	18	20	20	20	20	20	
도비	56	9	10	10	9	9	9	
시비	110	3	4	28	25	25	25	시비 추가

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원 어린이집 수	개소	70	76	67	64	64	64	64
어린이집 교재교구비 지원	백만원	266	34	58	54	54	54	54

9 보육교직원 복지 혜택 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-③	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

여성청소년과 보육팀장 최민희 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

□ 사업개요

○ 보육교직원 장기근속수당 확대 지원

- 보육교직원 복지 혜택 확대를 위해 국공립어린이집 교직원에 비해 처우가 열악한 민간·가정어린이집 교직원과 원장의 장기근속수당을 증액하고자 함.
- 장기 근무 보육교사 처우 지원을 통해 유능한 보육 인력 확보 및 보육 교직원의 이직률을 낮춰 아동의 안정된 보육 환경 조성 도모

○ 지원 대상 및 내용

대 상	현행(2022)	변동(2023~2024)
5년 이상 근무 국공립·법인 교직원	5만원	동일 지원
2년 이상 근무 민간·가정 교직원	5만원	8만원
3년 이상 근무 민간·가정 교직원	7만원	
5년 이상 근무 민간·가정 원장	7만원	8만원

○ 지원 시기 및 방법 : 매월, 보육 교직원 계좌로 직접 입금

□ 추진실적

- 2022. 9. : 추진계획 수립
- 2022. 12. : 2023년 본예산 반영
- 2023. 1.~ : 매월 지원 중

□ 향후 추진계획

- 지속 추진

□ 기대효과

- 민간·가정어린이집 교직원 및 원장과 국공립 교직원 간의 처우 등 격차 해소
- 보육 교직원의 장기재직으로 보육환경 안정감이 높아져 보육의 질 향상

□ **소요예산**

○ 예산총액 : 222백만원(2025년 기준)

- 국공립·법인어린이집 교직원 5만원 * 50명 * 12월 = 30백만원
- 민간·가정어린이집 원장 및 교직원 8만원 * 200명 * 12월 = 192백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,227	161	153	211	250	222	230	
시비	1,227	161	153	211	250	222	230	

□ **민선8기 로드맵**

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지급대상 보육교직원 수	명	240	236	240	230	220	220	220
보육교직원 장기근속수당	백만원	997	153	211	250	222	120	120

10 청년창업지원센터 건립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑩	중기	임기내	동두천시	신규	완료	도·시비

여성청소년과 청소년지원팀장 이현주 ☎ 2435, 담당자 서현철 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 창업을 희망하는 청년들에게 각종 창업교육 및 전문가 멘토링 지원서비스 연계 등 창업에 필요한 종합적인 서비스 제공을 위한 공간 조성
- 추진근거 : 동두천시 청년 기본 조례 제4조, 14조
- 대 상 : 19~39세 관내 거주 취·창업 준비 청년
- 위 치 : 복합문화커뮤니티센터 1층 / 1,157㎡
- 주요시설 : 교육(프로그램)실, 다목적회의실, 독립오피스(소형~중형), 물품 보관창고, 공유오피스, 운영사무실, 라운지, 청년카페 등

□ 추진실적

- 2022. 1. : 복합문화커뮤니티센터 공사 착공
- 2022. 11. : 복합문화커뮤니티센터 2층에서 1층으로 위치 변경
- 2023. 3. : 경기청년공간 신규 조성 사업 공모 선정(도비 1.5억 확보)
- 2023. 3. ~ 6. : 청년창업지원센터 우수사례 벤치마킹(5개 시군)
- 2023. 7. : 청년창업지원센터 민간위탁 추진계획 수립
- 2023. 9. : 「동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」 제정
- 2023. 9. : 청년창업지원센터 민간위탁 동의(안) 시의회 의결
- 2024. 1. : 내부 인테리어 설계 용역
- 2024. 3. : 청년창업지원센터 위탁기관 선정(인덕대학교)
- 2024. 1. ~ 5. : 기본 및 실시설계 용역
- 2024. 6. ~ 9. : 내부 인테리어 공사
- 2024. 11. 20. : 청년창업지원센터 개소 및 입주기업 모집

□ **향후 추진계획**

○ 해당없음

□ **기대효과**

○ 예비 청년 창업가를 위한 업무공간과 창업프로그램, 기술·경영 정보 제공 등 체계적인 지원을 통해 창업역량 강화

□ **민선8기 로드맵**

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
복합문화커뮤니티센터 건립																	
복합문화커뮤니티센터 1층 내부인테리어 공사 추진																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	580		500	80			
국비							
도비	150		150				
시비	430		350	80			
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
건립률	%	100	50%	80%	100%			

11

청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련

※ 도지사 공약(4,5번) : 스타트업 활성화로 일자리 창출, 스케일업 집중지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑪	중기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

경기도 벤처스타트업과 벤처창업육성팀장 장국범 ☎ 8008-6724

동두천시 가족지원과 청소년지원팀장 이현주 ☎ 2435, 담당자 서현철 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 지역 청년기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업지속력 향상 및 청년 일자리 창출을 도모하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함
- 추진근거 : 「동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」
- 대 상 : 19~39세 관내 거주 창업 준비 청년
- 사업내용
 - (사업화지원) 시제품제작, 기업홍보 등 창업 성장지원을 위한 사업화 자금 지원
 - (역량강화) 창업교육, 멘토링 등 역량강화 프로그램 운영

□ 추진실적

- 2024. 7. : 경기도 지정형 창업혁신 공간 선정(도비 1천만원)
- 2024. 11. : 동두천시 청년창업지원센터 개소
- 2024. 11. : 「창업경진대회 입주기업 오디션」 입주기업 모집
- 2024. 12. : 입주기업 선발(4개 기업) 및 우수기업 시장 반응조사 지원 (3개 기업/200만원)
- 2025. 2. : 청년 창업 기업 입주 모집 및 선정(2개 기업)
- 2025. 3. : 경기청년공간 프로그램 운영 사업 선정(1억 5천만원)
- 2025. 4. ~ : 경기청년공간 프로그램 운영(창업아카데미, 리빙랩 등)
- 2025. 5. : 경기도 지정형 창업혁신 공간 선정(도비 3천만원)
- 2025. 6. : 청년창업지원센터 입주기업 모집 및 선정(6개 기업)
- 2025. 9. : 청년창업지원센터 입주기업 평가 및 사업화 자금 지원 (4개 기업/250만원)

□ **향후 추진계획**

- 각종 공모(중소기업벤처부, 고용노동부, 경기도 등) 일정 모니터링을 통한 다양한 자금 확보 경로 파악
- 청년창업지원센터 입주기업의 특성을 반영한 맞춤형 사업화자금을 지원하여 성장 촉진 도모

□ **기대효과**

- 지역 청년 기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업 지속력을 향상하여 지역 경제 활성화 및 지역 정착 기여

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수운영 시군 벤치마킹																					
자금확보																					
청년 창업 자금지원																					

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		이전	2023년	2024년	2025년	
시비	18			6	12	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표(누계)					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
자금지원 업체 수	개소	7			3	7		

12

다문화가족 자녀 사회포용안전망 사업

※ 도지사 공약(235,236번) : 가정통신문 번역 및 다문화가족 청소년 상담 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑰	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

경기도 가족다문화과 다문화지원팀장 정진호 ☎ 8008-2486

동두천시 여성청소년과 이민사회지원팀장 김경희 ☎ 2125, 담당자 이서영 ☎ 2370

□ 사업개요

○ 목 적 : 다문화가족 학령기 자녀의 학교적응 지원 및 미래인재 육성

○ 사업내용

- 기초학습 지원

· 대상 : 3~12세 다문화 아동·청소년 *미취학(3~6세), 저학년(1~3학년), 고학년(4~6학년)

· 내용 : 기초 한글, 수학 등 기본 학습지원 및 초등학교 생활·교육과정 안내

- 진로설계 지원

· 대상 : 7~18세 다문화 아동·청소년

· 내용 : 체계적이고 전문적인 심리상담을 통해 진로·취업 컨설팅 제공

○ 시행기관 : 동두천시 가족센터(센터장 이정숙, 중앙로 245 두드림희망센터 2층)

□ 추진경과

○ 2023. 1.~ : 직원 채용 및 1분기 보조금 교부

○ 2023. 2.~3. : 사업홍보 및 대상자 모집

○ 2023. 3.~4. : 상상드림(한국어교육센터) 리모델링 및 개소

○ 2023. 4.~ : 프로그램 운영 및 분기별 보조금 지급

○ 2023. 12.~ : 정산 및 사업평가

○ 2024. 1.~ : 분기별 보조금 교부 및 정산

□ 문제점 해결

- 교육 및 상담 공간 확보를 위한 한국어교육센터(상상드림) 개소
 - 소재지 : 중앙로245번길 12-13, 생연2동 경로당 (지하1층, 지상1~2층, 연면적 191.98㎡)
 - 추진과정
 - 2023. 2. 17. 재산관리관 변경(사회복지과→여성청소년과)
 - 2023. 2. 23. 동두천시-동두천시 가족센터 간 대부계약 체결
 - 2023. 4. 5. 상상드림 개소(국제로타리클럽 사업 공모하여 사업비 확보, 내부 인테리어 공사)
 - 2023. 6. 옥상 방수 공사 완료(건물 노후로 인한 옥상 누수 발생으로 신속한 보수)

□ 기대효과

- 다문화가족 자녀의 지원체계 강화로 안정적인 한국 사회 정착 및 글로벌 인재 육성 기여

□ 향후 추진계획

- 지속 추진

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	393		90	100	103	100	
국비	200	-	45	50	55	50	
도비							
시비	193	-	45	50	48	50	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
참여자 수	명	100	-	100	100	100	100	100

13 문화 예술 도시 및 문화 트렌드 개발

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-④)	단기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비

문화예술과 문화예술팀장 이득만 ☎ 2070, 담당자 유재복 ☎ 3105

□ 사업개요 및 목표

- 지역 예술인 창작지원, 시민문화예술 활성화 등을 통해 문화예술 도시로 나아가는 기반을 조성하고 급변하는 문화트렌드에 대응함
- 기존 문화단체 역량 강화와 함께 새로운 문화·예술인 및 단체 발굴을 위한 다각도 공모사업을 추진하고 전문적으로 운영하여 문화·예술 도시 인프라 확충

□ 사업현황

구분(공약내용)	사업명	사업비	추진계획	비고
지역예술인 창작지원	공공미술 프로젝트	100백만원	예술인 간담회 실시 4월 / 작품 활동 및 설치(7월~11월)	도비보조
	예술인 기회소득지원	84백만원	예술인 기회소득지원(7월~12월)	도비보조
	장애예술인 창작지원	10백만원	장애예술인 대상 작품활동, 전시 등 예술활동 지원	도비보조
문화예술활동 지원사업 강화	지역문화 활성화 지원사업	65백만원	공모를 통해 문화예술 단체, 청년 지역문화, 공공예술 지원 (4월~11월)	자체사업
지역문화 역량강화 및 교육 활성화	생활문화 네트워크 활성화	5백만원	고용복지 연계사업 5월~11월	자체사업

□ 추진실적

- 2024. 5. : 지역문화 활성화 지원사업 공모 선정 완료 (1식)
- 2024. 5.~12. : 지역문화 활성화 지원사업 단체 선정 및 사업 추진(15개팀)
- 2024. 3.~12. : 장애예술인 창작지원 사업 추진
- 2024. 5.~11. : 생활문화센터 스마트미디어교육 사업(고용복지연계)
- 2024. 6. : 공공미술 프로젝트 공모 선정(박물관 법면 1개소)

□ 기대효과

- 다양한 민간활동 발굴을 통해 지역문화 활성화의 기초 토대 형성

□ 민선8기 로드맵

- 소요 예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	627			299	328			
국비								
도비	183			75	108			
시비	444			224	220			
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역예술인창작지원	건	6		3	3			
문화예술활동 강화	건	4		2	2			
지역문화역량강화	건	2		1	1			

14 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑩	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체
사회복지과	장애인복지팀장	권민정 ☎ 2235, 담당자 김경단 ☎ 2156				
체육관광과	반다비체육센터팀장	정희광 ☎ 2893, 담당자 김진기 ☎ 2895				

□ 사업개요

- 사업목표 : 장애인 보호자의 삶의 질 향상을 위한 공간 조성
- 사업대상 : 장애인복지관, 반다비체육센터 이용 장애인의 보호자
- 사업비 : 19백만원(2023년 기준)
- 사업내용
 - 장애인복지관 : 7백만원(2층에 보호자 등 대기실 운영)
 - 반다비체육센터 : 12백만원(카페라운지에 장애인 및 장애인보호자 힐링센터 운영)

□ 추진실적

- 2023. 1. : 장애인복지관 휴게공간 조성 및 운영
- 2023. 9. : 제3회추경 예산확보 및 항목별 계약 추진
- 2023. 10. : 힐링공간 인테리어 조성 및 운영(소품 및 민원인용 PC 2대)

□ 기대효과

- 장애인시설 내 휴식공간을 제공하여 장애인과 보호자의 정서적 안정에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획 수립				■			■										
장애인복지관 휴게공간 운영					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
반다비체육센터 힐링센터 운영								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	19		19				
국비							
도비							
시비	19		19				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
힐링센터 설치개소 수	개소	2		2				

15 시민 건강증진을 위한 아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-42	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비
체육관광과	체육진흥팀장	전성희 ☎ 2205,	담당자	이정민 ☎ 2209		
체육관광과	체육시설팀장	김복겸 ☎ 2823,	담당자	이지훈 ☎ 2824		

□ 사업개요 및 목표

- 우리 시는 사방이 산으로 둘러싸인 천혜의 자연환경을 가지고 있어, 산악 지형을 활용한 레저스포츠 활성화를 위해 트레일러닝 대회, MTB(산악자전거) 대회 등 유치, 매년 1~2천명이 동두천시를 방문하고 있음
- 더불어 가용부지를 활용, 실내·외 공공체육시설을 확충하고 시민들의 건강증진 및 여가선용을 위한 생활체육프로그램을 지속적으로 확대하여 시민들의 아웃도어 레저스포츠를 활성화하고, 누구나 쉽게 여가활동을 즐길 수 있도록 하고자 함

□ 사업 추진실적

- 레저스포츠 대회 개최
 - 동두천 KOREA 50K 국제 트레일러닝대회
 - ※ 2022년 대회 : 9. 17.(토) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 4. 29.(토) 개최, 약 1,700여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2024년 대회 : 4. 26.~4. 27. 개최, 1일 2,000여 명 참가
 - ※ 2025년 대회 : 4. 25.~4. 26. 개최, 1일 2,300여 명 참가
 - 동두천 왕방산 MTB대회
 - ※ 2022년 대회 : 10. 23.(일) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 10. 15.(일) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2024년 대회 : 10. 27.(일) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2025년 대회 : 10. 19.(일) 개최, 약 700여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
- 생활체육프로그램 운영
 - 운영기간 : 연중(분기별 모집)
 - 운영주체 : 동두천시체육회
 - 운영장소 : 국민체육센터(천보산로 688)
 - 프로그램 현황 : 성인(8개), 유·청소년(5개)

○ 공공체육시설 조성 및 부대시설 설치 등

사업명	위 치	사업비	진행상황	비 고
보산동 생활체육센터 조성	보산동 314-5 일원 (보산동 행정복지센터)	30,000백만원 (국비 50%, 시비 50%)	건축기획용역 완료 중앙투자심사 완료 토지보상 진행 중	2025년 사업추진 중
종합운동장 테니스장 유지보수 (실내테니스장 조성)	종합운동장 테니스장	2,400백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2024. 5. 착공 2025. 2. 준공	완료
공공체육시설 개보수	배드민턴 전용구장	500백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2023. 5. 실시설계 완료 2023. 8. 공사 착공 2024. 1. 공사 준공	완료
공공체육시설 개보수	공도장(동호정)	120백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
국민체육센터 헬스장 보강	국민체육센터 (2층)	1,900백만원 (국비 1,300 시비 600)	2024. 8. 준공	완료
종합운동장 테니스장 추가설치	종합운동장 테니스장	350백만원 (시비)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
동양대학교 운동장 야간조명시설 등 설치	동양대학교 축구장	502백만원 (시비)	2022. 7월 준공	완료

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
레저스포츠 대회 개최	회	2	2	2	2	1		
생활체육프로그램 운영	건	13	13					
공공체육시설 조성 및 부대시설 설치	개소	7	3		2	1	1	

16

소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대

※ 도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑬	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체 예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀 서기석 ☎ 2277, 담당자 김건하 ☎ 2278

□ 사업개요

○ 사업명 : 소상공인 특례보증 이차보전* 지원

* 특례보증에 따른 금융기관으로부터 받은 융자금에 대한 이차 지원


○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 특례보증을 통해 대출을 실행한 동두천시 소재 소상공인

○ 사업내용 : 소상공인 특례보증 대출이자 연 2% 이내 2년까지 지원

○ 사업비 : 95백만 원(2025년 본예산 기준)

○ 지원절차



□ 추진실적

○ 2022. 12. 27.(화) 업무협약(금융기관)

○ 2024. 1. ~ 12. 2024년도 이차보전금 분기별 지급

○ 2024. 1. ~ 12. : 176건

○ 2025. 1. ~ 12. 2025년도 이차보전금 분기별 지급

○ 2025. 1. ~ 12. : 198건

□ 기대효과

- 특례보증 대출금 이자 지원을 통한 경영 애로 소상공인 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
업무협약				■													
사업계획 수립 및 예산 편성			■	■			■	■			■	■			■	■	
사업추진(이차보전금 지급)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	225		40	90	95		
국비							
도비							
시비	225		40	90	95		
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2027년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	200	-	200	200	200		

17

소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원

※도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑭	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체 예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀 서기석 ☎ 2277, 담당자 김건하 ☎ 2278

□ 사업개요

- 사업명 : 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 동두천시 소재 소상공인, 중소기업
- 사업내용 : 기간 내 신규 접수된 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 (보증액의 1%) 지원
- 사업비 : 60백만 원(2025년 본예산 기준)
 - 소상공인 40백만 원, 중소기업 20백만 원

□ 추진실적

- 2022. 12. 27.(화) 업무협약(경기신용보증재단)
- 2023. 1. 출연금 출연
- 2023. 1. ~ 12. 지원실적
 - 소상공인 : 232건 / 70백만 원
 - 중소기업 : 13건 / 1,929백만 원
- 2024. 1. 출연금 출연
- 2024. 1. ~ 12. 지원실적
 - 소상공인 : 276건 / 67백만 원
 - 중소기업 : 9건 / 1,397백만 원
- 2025. 1. 출연금 출연
- 2025. 1.~12. 지원실적
 - 소상공인 : 297건 / 80백만 원
 - 중소기업 : 13건 / 1,656백만 원

□ 기대효과

- 특례보증 수수료 지원을 통한 경영 애로 소상공인·중소기업 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	263	-	100	103	60	-	
국비							
도비							
시비	263	-	100	103	60	-	

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
업무협약				■														
사업계획 수립 및 예산 편성			■	■			■	■				■	■				■	■
사업추진(특례보증 수수료 지원)					■													

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2027년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	360	-	120	120	120		

18

저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화

※ 도지사 공약(248번) : 재생에너지 활성화 및 에너지 전환 기반 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

경기도 기후에너지정책과 안재용 ☎ 8008-6022

동두천시 일자리경제과 에너지팀장 채미정 ☎ 2327, 담당자 김채현 ☎ 2329

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 태양광 발전설비 설치 희망자
- 사 업 비 : 1,136백만 원 (국비 439, 도비 36, 시비 432, 자부담 229)
 - 미니태양광 보급지원사업 : 33백만 원 (도비 13 시비 13 자부담 7)
 - 신재생에너지보급 주택지원사업 : 74백만 원 (국비 27, 시비 15, 자부담 32)
 - 경기도 주택태양광(3kW) 지원사업 : 59백만 원 (도비 23, 시비 12, 자부담 24)
 - 신재생에너지보급 융복합지원사업 : 970백만 원 (국비 412, 시비 392, 자부담 166)
- 내 용 : 미니태양광 보급지원사업 등 4개 사업 추진

□ 추진실적

- 2025. 12. : 2025년 신재생에너지보급 융복합지원사업 56개소 설치 완료
- 2025. 12. : 2025년 신재생에너지보급 주택지원사업 14가구 설치 완료
- 2025. 12. : 2025년 미니태양광 보급지원사업 20가구 설치 완료
- 2025. 12. : 2025년 경기도 주택태양광(3kW) 지원사업 12가구 설치 완료

□ 기대효과

- 온실가스 배출 감소에 따른 지구환경 보호
- 에너지 수급의 불확실성을 낮추고 전력공급 안정성 향상

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
미니태양광 보급지원사업	[Progress bars across 2022-2025]																
신재생에너지보급 주택지원사업	[Progress bars across 2022-2025]																
경기도 주택태양광(3kW) 지원사업									[Progress bars across 2024-2025]								
동두천시 녹색에너지 보급 주택지원사업					[Progress bars across 2023-2024]												
신재생에너지 확대기반조성사업					[Progress bars across 2023-2024]												
신재생에너지보급 융복합지원사업													[Progress bars across 2025]				

○ 소요 예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별 예산액				
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합계	2,971	283	330	336	1,136	886
국비	1,029	129	119	43	439	299
도비	255	35	31	126	36	27
시비	1,025	62	127	79	432	325
자부담	662	57	53	88	229	235

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원용량	kW	887.3	163.3	162	192	180	97	190

19 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑱	장기	임기후	동두천시	신규	완료	국·시비

한국폴리텍 기획부장 김태우 ☎032-650-6620, 기획부 민상준 ☎032-650-6627
 일자리경제과 일자리정책팀장 이수원 ☎ 2483, 담당자 배종곤 ☎ 2369

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2029. 12.
- 총사업비 : 38,458백만 원(국비 32,548, 시비 5,910)
 - (폴리텍 추진/국비) 공사비 27,137백만 원, 시설부대비 5,411백만 원)
 - (동두천시 제공/시비) 부지 매입비 5,910백만 원
- 대 상 지 : 동두천시 생연동 523-1번지 일원
- 규 모 : 연면적 8,000㎡ 내외 신축
- 운영과정
 - 비학위과정 (전문기술과정 및 하이테크과정 등)
 - 지역수요에 필요한 재직자 향상훈련, 신중년, 여성재취업 등 과정 운영

□ 추진현황 및 계획

- 2022. 3. : 폴리텍대학 동두천교육원 설립 추진
- 2022. 11. ~ 12. : 대상사업 선정을 위한 비용편익 분석 수행
- 2023. 4. : 대상사업 선정(폴리텍 심사)
- 2023. 5. ~ 2024. 5. : 한국직업능력연구원 타당성조사
- 2024. 6. ~ 12. : 고용노동부 타당성조사 심의·승인
- 2024. 12. : 폴리텍 동두천교육원 부지 매입
- 2026. 1. ~ 2029. 12. : 설계, 건축공사 등 설립 추진(폴리텍 추진)
- 2029. 12. : 고용노동부 최종 승인

□ 문제점 및 해결방안

- 폴리텍대학에서 국비로 추진하는 사업으로 향후 교육원 설계 및 건축 준공까지 약 4년의 공사 기간이 소요 예정
- 국비 예산편성에 따라 최종 준공 시기 결정(2026년부터 순차적 예산 편성)

□ 기대효과

- 국가산단 등 지역 내 업종과 연계하여 지역수요 맞춤형 인재 양성
- 폴리텍대학교 교육원 설립을 통한 지역경제 활성화 및 배움의 기회 확대

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
비용편익분석				■																	
타당성조사					■	■	■	■	■	■	■	■									
설치승인 및 설립계획 수립												■	■								
공공건축 심의 및 조달 계약													■	■	■	■	■	■	■	■	4년

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	38,458					32,548	
국비	32,548					32,548	
도비							
시비	5,910			5,910			
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
타당성조사 및 설치 승인	식	승인		조사	승인			
폴리텍교육원 준공	개소	준공					심의 및 조달	준공 (2029.12.)

20 친환경 차량 보급 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉓	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 첨단모빌리티산업과장 정한규 ☎ 031-8008-5711 담당자 권다빈 ☎ 031-8008-5718
 환경보호과 대기관리팀장 조용희 ☎ 2242, 담당자 신동혁 ☎ 2243

□ 사업개요

- 친환경 차량(전기자동차, 수소자동차, 전기이륜차) 구매 시 보조금 지급

□ 추진계획 (2025년)

(단위 : 백만원)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
사업비	3,182	195	20.8	
대 수	455	6	13	

□ 추진실적

(단위 : 대)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
2022년	143	1	15	
2023년	190	6	6	
2024년	122	4	8	
2025년	212	5	7	
누계	667	16	36	

□ 향후 추진계획

- 친환경 자동차 보조금에 대한 홍보 강화

□ 기대효과

- 친환경 자동차 보급 확대를 통한 대기환경 개선

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부상황																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액							비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이후	
계	21,051	4,930	3,418	4,103	2,915	2,687	2,999		
국비	13,313	3,272	2,148	2,476	1,837	1,555	2,025		
도비	262	-	-	168	63	21	10.3		
시비	7,476	1,658	1,270	1,459	1,015	1,111	963.7		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 6월말	2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
보급대수	대	1,020	180	230	280	330	85	185	

21

친환경 차량 충전 기반시설 확충

※ 도지사 공약(256번) : 전기차 충전소 등 친환경 교통인프라 확충

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 첨단모빌리티산업과장 정한규 ☎ 8008-5711 친환경보급팀장 전정순 ☎ 8008-5716
 동두천시 환경보호과 대기관리팀장 조용희 ☎ 2242, 담당자 조혜진 ☎ 2239

□ 사업개요

- 친환경 자동차(전기자동차) 충전 기반시설 확충

□ 추진계획

- 2025년까지 공영주차장 등에 개방형 충전기 100기 이상 설치
 - ※ 2025. 12. 현재 동두천에 등록된 전기자동차 / 충전기 : 1,063대 / 637기
- 2025년 신규 공영주차장 등 수요 반영하여 추진

□ 추진실적

구분	~2024년	2025	비고
보급대수	59기	28	

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 기존 공영주차장 및 의무설치 대상 시설의 전기차 충전구역은 대부분 설치가 완료되어, 추가 수요가 제한적인 상황
- 대책
 - 새로 조성되는 공영주차장 및 신규 시설 등 수요를 반영하여 설치

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표				2026년 6월말	2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년		
보급대수	기	100	25	25	25	25	-	-

- 소요예산액 : 비예산

22 신천 수질개선 종합대책 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉞	장기	임기후	동두천시	계속	완료	도·시비
경기도 기후환경관리과장 김경호 ☎8008-8200 북부환경관리팀장 김문수 ☎8030-4251 환경보호과 수질총량팀장 김택수 ☎2236, 담당자 이지혜 ☎ 2260						

□ 사업개요

- 신천 상·중류 수질 악화에 따라 「1차 신천 수질개선 종합대책」 마련('16~' 20)
 - 그 결과 BOD는 개선되어 수질개선 종합대책 목표기준 달성('20)
 - 한탄강 중권역 BOD : (목표) 2.0mg/L → (달성) 1.2mg/L
 - 신천하류(신천3) BOD : (목표) 9.0mg/L → (달성) 5.2mg/L
 - 신천 수질개선에도 불구하고 색도 수질오염에 대한 지적 지속 발생
 - 한탄강 색도 개선을 위한 대표지점 및 목표수질 설정함
 - 한탄강 중권역(대표지점:연천 세월교) 색도 목표 : 15도 이하(현행 18도)
 - 공공하수처리시설 방류수 색도 목표 : 50도 이하(현행 200도)
- ※ 근거 : 경기도 한탄강 수계 색도개선 타당성 연구 용역보고(22. 2)

□ 추진계획

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공하수처리시설 방류수 색도	도	50	100	80	70	50	50	50
폐수배출사업장 위반율	%	10	10	10	10	10	10	10

□ 추진실적

확인지표	단위	목표 총계	연도별 추진 실적				비 고
			2022년	2023년	2024년	2025년 12월 기준	
공공하수처리시설 방류수 색도	도	50	66	52	46	43	목표 달성
폐수배출사업장 위반율	%	10	31	24	33	15	

□ 세부 추진실적

- 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 운영
 - 한강유역환경청 주관 “신천 수질개선협의회” 추진중 (총 16회)
 - 경기도 주관 “한탄강 수질개선실무협의회” 추진완료 (총 10회)
- 폐수배출사업장 지도점검 : 총 48개소 (위반건수 : 7건)
 - 점검기간 : 2025 1. ~ 12.
 - 점검대상 : 관내 폐수배출업소
 - 점검내용 : 배출시설 및 방지시설 관리기준 여부
- 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 1개소, 70백만원
 - 사업기간 : 2025. 3. ~ 12.
 - 사업대상 : 관내 폐수배출사업장 1개소
 - 사업내용 : 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 지원(자부담30%, 최대 7천만원)
- 개인하수처리시설 지도점검 : 총 41개소(위반업소: 3건)
 - 점검기간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 점검대상 : 청정계곡 우수처리시설 등 61개소
 - 점검내용 : 개인하수처리시설 방류수 수질검사 및 관리기준 준수 여부
- 신천 수질 모니터링 실시 : 매월 1회 (6지점, BOD 외 6개 항목 수질검사)
- 공공하수처리시설 색도처리시설 설치사업 추진
 - 공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 중지 중(2023. 10.~)

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 영세사업장의 시설 개·보수의 비용부담으로 인해 위반사례 반복
 - 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 지원 확대 요구
- 동두천하수처리시설 방류수 색도 주원인인 동두천산업단지 내 고농도 염색 폐수 유입
 - 폐수 배출업소 점검만으로는 색도개선에 한계, 현행 동두천 산업단지 방류수 색도기준 강화 건의(현행 800도→ 200도)

□ **향후 추진계획**

- 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 협력 강화
- 수질오염물질 배출시설 적정 관리
 - 폐수오염원 배출 최소화 관리
 - 개인하수의 적정 처리 도모
 - 하천 수질 모니터링 실시
- 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 1개소, 70백만원
- 공공하수처리장 색도 저감시설 실시설계 용역 및 설치 공사 추진
 - 색도 저감시설 설치공사 예정

□ **기대효과**

- 시민들의 편의 증진, 관광객에 대한 우리 시 이미지 개선 도모
- 시민에게 깨끗하고 청결한 생태환경 제공

□ **민선8기 로드맵**

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신천 수질개선 협의회 추진																	
수질 모니터링 및 배출업소 관리 강화																	
공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업																	

- 소요예산액

- 폐수처리시설 설치 지원사업 등 3개 사업

(단위: 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	772	242	185	115	115	115	
도비	241	66	70	35	35	35	
시비	531	176	115	80	80	80	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공하수처리시설 방류수 색도	도	50도	100도	80도	70도	50도	50도	50도
폐수배출사업장 위반율	%	10	10	10	10	10	10	10

23

등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련

※도지사 공약(177번) : 반려동물 양육자 기본교육 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-19	단기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비

경기도 반려동물과 반려동물정책팀장 배태근 ☎ 8030-4471,
 동두천시 농업축산위생과 동물보호팀장 양정연 ☎ 2318, 담당자 문성안 ☎ 2322

□ 사업개요

- 목 적 : 체계적인 반려동물 교육을 통한 올바른 반려동물 문화 정착
- 대 상 : 동두천시민 및 학생
- 기 간 : 2022. 11 ~ 2025. 12.(4개년)
- 사 업 비 : 68.5백만원
- 내 용
 - 반려동물의 생애에 걸쳐 보호자가 알아야 하는 기본교육
 - 반려동물의 문제행동(공격성, 하울링 등) 상담 프로그램 운영

□ 추진계획

- 2026. ~ : 매년 반려동물 문화교실(강연, 프로그램 등) 추진

□ 추진실적

- 2022. 11. ~ 12. : 2022년 반려동물 문화교실 추진(10회)
 - 초등학교 3개교 / 반려동물 에티켓, 개물림 사고 예방교육



○ 2023. 11. 5.(일) : 2023년 동두천시 반려동물 토크콘서트 개최
 - 토크콘서트(설채현 수의사) 및 행동교정교육



○ 2024. 9. ~ 12. : 2024년 반려동물 문화교실 추진(10회)
 - 반려동물 산책교육, 반려동물 교감교육, 찾아가는 홈클래스



○ 2025. 11. 14.(금) : 2025년 반려동물 문화교실 개최
 - 찾아가는 홈클래스, 문제행동상담, 토크콘서트, 반려견증명사진, 인식표만들기 등



□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	88.5		8.5	20	20	20	20	
도비	24			6	6	6	6	
시비	64.5		8.5	14	14	14	14	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
문화강좌교육	회	4	1	1	1	1		

24 교통약자를 배려하는 길

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비
경기도 도로안전과장 천병문 ☎ 8030-3930, 도로운영팀장 이용원 ☎ 8030-3941 도로과 도로정비팀장 강동명 ☎ 2447, 담당자 엄상규 ☎ 2409						

□ 사업개요

- 교통약자의 안전성 향상을 위한 보행공간 제공
 - 차량과 분리된 보행공간 제공, 통학로 상 보행 안전시설 확충
- 교통약자의 이동 편의성 향상을 위한 시설 개선
 - 유효 보도폭 확보, 보행 동선 연결성 강화

□ 추진계획

- '22. 7. ~ '25. 2. : 동두천시 보행안전 및 편의증진 기본계획(2023~2027) 수립 용역 추진
- '23. 7. ~ '25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

□ 추진실적

- 동두천시 안전한 보행환경 조성사업(경기도)
 - 동두천초등학교 주변 보행자 우선도로 조성 사업(L=190m)
 - 2023. 1. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공
 - 지행동 714번지 일원 보행자 우선도로 조성 사업(L=250m)
 - 2023. 6. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 9. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
 - 청소년수련관~지행초등학교 일원 통학로 정비사업(L=400m)
 - 2024. 3. : 실시설계 용역 착수
 - 2024. 5. ~ 6. : 공사 착공 및 준공
 - 신천초등학교 일원 도로 및 보도정비사업(L=400m)
 - 2024. 7. ~ 8. : 실시설계 용역 착수 및 준공
 - 2024. 10. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ **향후 추진계획**

○ '23. 7. ~ '25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

□ **기대효과**

○ 차량과 분리된 보행 공간 및 안전시설 제공을 통한 교통약자의 안전성 및 이동 편의성 확보

□ **개발 및 사업비 확보 방안**

○ 경기도 안전환경 조성 및 어린이보호구역 정비 등 공모사업 신청 및 추진

□ **민선8기 로드맵**

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 및 편의증진 기본계획 수립 용역																	
안전한 보행환경 조성사업																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,130		200	430	500		
국비							
도비	565		100	215	250		
시비	565		100	215	250		
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
안전한 보행환경 조성	m	1,200m		200m	400m	600m		

25 초등학생 대상 치과 증진 사업 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-④	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

건강증진과 건강증진팀장 김혜원 ☎ 3381, 담당자 서현정 ☎ 3392

□ 사업개요

- 추진목적 : 초등학생의 올바른 구강관리습관 형성 및 자발적인 구강건강 생활실천을 향상
- 사업대상 : 관내 초등학교 11개소 학생(3,500여명)
- 내 용
 - 관내 초등학교 대상 찾아가는 구강교실 확대 운영(학교별 연 1회 이상)
 - 구강건강꾸러미(구강용품 및 교육자료) 개별 지급
 - 치면세균막 간이검사기 대여 및 불소용액양치사업 연계 추진
- 근거법령 : 「구강보건법」 「국민건강증진법」 제17조, 제18조, 제19조제2항 제4호 등

□ 추진현황

- 관내 초등학교 11개소 중 11개소 완료

구 분	학교명	참여 인원 (단위:명)	방문일
1	보산초등학교	207	5/14
2	생연초등학교	211	5/9
3	동두천탑동초등학교	107	5/30
4	지행초등학교	865	7/9
5	동두천송내초등학교	300	6/4
6	사동초등학교	372	7/11
7	이담초등학교	467	11/19
8	동보초등학교	150	6/18
9	동두천신천초등학교	487	11/19
10	동두천초등학교	222	8/20
11	소요초등학교	76	7/18
4분기 추진 완료: 계 (단위: 명)		3,464	

○ 관련 사진



□ 추진계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립 (초등학생 튼튼이 구강교실, 건강증진과-22377)
- 2025. 1. : 동두천양주교육지원청 협력체계 구축 및 사업홍보
- 2025. 1. ~ 6. : 대상자 모집 및 신청접수
- 2025. 3. ~ 11. : 사업 운영 및 서비스 제공
- 2025. 12. : 사업종료 및 평가

□ 기대효과

- 포괄적 예방처치 및 전문가 위생관리 서비스를 통한 구강건강행태 및 자기효능감 향상 기여
- 구강 관리가 중요한 시기인 초등학생에게 올바른 구강건강관리 정보를 전달함으로써 초등학생 구강보건 수준 향상을 도움

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	연도별 예산액					비 고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	60	10	12	14	12	12	
국비	23	5	6	4.2	3.6	3.6	
시비	37	5	6	9.8	8.4	8.4	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
치과증진사업 학교참여	개소	11	11	11	11	11	2	9

동두천시 산후조리비 지원

※ 도지사 공약(130번) : 공공산후조리원 등 4대 필수의료시설 설치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
I-⑤	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

경기도 건강증진과 가족건강팀장 김은미 ☎ 8030-3261

동두천시 건강증진과 건강증진팀장 김혜원 ☎ 3381, 담당자 박수린 ☎ 3490

□ 사업개요

- 추진목적 : 민선8기 시장공약사업인 “공공산후조리원 건립 운영”에 대하여 장기적인 시간이 소요됨에 따라 즉시 지원 가능한 산후조리비 지원 사업으로 변경하여 임신부의 경제적 부담완화 및 건강한 출산과 양육환경 조성
- 사업대상 및 사업내용
 - 지원대상 : ① 신생아 출생신고지가 동두천시이며, 신생아 출생일 기준 동두천시에 1년 이상 거주한 부 또는 모 (소득무관)
 - ② 임신확인서 상 ‘임신확인일’로부터 16주 이후의 유산·사산일 기준으로 1년 이전부터 동두천시에 거주한 부 또는 모
 - ③ 신생아가 사망한 경우
 - 사업규모 : 약 360명 (‘24년 출생아 기준)
 - 신청기간 : 출생일, 유산·사산일로부터 1년 이내
 - 지원금액 : 출산모, 유산·사산모 1인당 100만원 현금 지원
 - 지원방법 : 동 행정복지센터 접수, 보건소에서 지원
 - 소요예산 : 360백만원(시비 100%)
- 근거법령
 - 「저출산·고령사회 기본법」 제8조(자녀의 출산과 보육 등)
 - 「저출산·고령사회 기본법」 제10조(경제적 부담의 경감)
 - 「모자보건법」 제3조(국가와 지방자치단체의 책임)
 - 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 제4조(국가등의 책무)

□ **추진현황 및 추진실적**

- 2022. 11. 2. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 계획
- 2022. 11. 3. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 보고 완료(의회)
- 2022. 11. 15. : 공약사항 변경 추진(공공산후조리원 건립→산후조리비 지원)
- 2023. 4. : 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례 전부 개정
- 2023. 6.~ : 2023. 1. 1.부터 적용하여 산후조리비 소급 지원
- 2023. 12. : 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례 일부 개정
- 산후조리비 지급 : 총 688명(23년 : 247명 / 24년 : 247명 / 25년 1월~9월 : 194명)

□ **기대효과**

- 산모·신생아 건강증진 및 출산가정 경제적 부담 완화
- 아이 낳기 좋은 환경 조성 및 출산 장려 분위기 확산 도모
- 인구 유입 및 임신부 등 건강증진
- 임신과 출산에 따른 가계부담 완화 등

□ **민선8기 로드맵**

- 소요예산액

(단위 : 명, 백만원)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비 고
수혜인원	247	247	360	360	360	
소요예산	247	247	360	360	360	시비 100%

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
동두천시 산후조리비 지원자 수	명	1,214		247	247	360	180	180

27 비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉞	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비
건강증진과 치매안심센터팀장 신미숙 ☎ 3368, 담당자 이수현 ☎ 3363						

□ 사업개요

- 추진목적 : 치매조기검진 접근성 제공으로 치매 예방 및 조기 발견 강화
- 사업대상 : 60세 이상 노인
- 사업내용 : 비대면 치매위험도 자가검사 도입 및 홍보
 - 치매 위험 정도 및 검진 필요성을 직접 확인할 수 있는 비대면 사전 자가검사
 - 비대면 자가검사(치매체크앱) 애플리케이션 활용 및 홍보
 - 애플리케이션 등 활용이 불가할 경우 자가검사 전단지 활용 및 홍보

□ 추진계획

- 모바일 앱 또는 자가검사지를 활용한 비대면 치매위험도 검사 시행
 - 모바일 앱 : 중앙치매센터의 ‘치매체크’ 앱 활용한 치매위험도 검사
 - 자가검사지 : 모바일 사용이 어려운 대상을 위해 비대면 자가검사지 배부
- 모바일 앱 검사 홍보 및 자가검사지 제작·배포
 - 홈페이지, SNS 등을 활용 홍보
 - 자가검사지 노인복지관 및 행정복지센터 등 비치
- 비대면 자가검사 결과 기억력 저하 대상 치매검진(선별검사, 진단검사 등) 관리

□ 추진현황 및 추진실적

- 2022. 8. 16. 공약사업 시행계획 수립
 - 공약사업 세부 시행계획 수립
 - 「비대면 치매조기검진 시스템」에서 세부 실천 사업으로 「비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행」으로 세부 시행계획 수립
- 2022. 10. 20.~ : 치매조기검진 및 자가검진 전단지 배부
 - 행정복지센터, 노인복지관 등 비치 및 치매안심센터 방문자 홍보
- 2023. 2.~ : 모바일 앱 검사 안내 및 비대면 자가검사 홍보
 - 보건소 홈페이지, 치매안심센터 공식 SNS 4개 채널 게시

- 동두천시 약사회 및 관내 약국 37개소 치매자가검진 안내문 배부 및 검사 연계협조
- 캠페인, 경로당 방문 홍보 실시
- 2024. 3.~7. : 독거어르신 등 대상별 맞춤형 비대면 검진 홍보(41건)
 - 치매조기검진 집중검진 대상(만 75세 진입자) : 검진안내 우편발송(1건, 884명)
 - 노인맞춤돌봄서비스대상자 : 생활지원사 연계 치매 자가진단 실시 홍보(1건, 864명), AI 간편 치매체크 검사 진행(1건, 229명)
 - 경로당 어르신 대상 : 찾아가는 치매인식개선 비대면 검진 안내(38건 / 470명)
- 2025. 5.~ : 노인일자리 참여자 치매조기검진 「건강관리 지원 시범사업」 실시(390명)

□ 기대효과

- 비대면 자가검사를 통해 치매조기검진 실천 강화
- 치매 발생 위험요인 예방관리 및 치매조기검진 서비스 제공 확대
- 치매 조기 발견으로 시민건강 보호에 기여 등

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
치매체크앱 홍보																	
자가검진 전단지 배부																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	5	1	1	1	1	1	
국비	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
도비	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
시비	0.85	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
비대면 치매위험도 자가검사 홍보 건수	건	100	20	20	20	20	10	10

28 초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기획 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑥	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

미래교육진흥원 교육지원팀장 홍성지 ☎ 3324, 담당자 이지예 ☎ 3307

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 꿈이룸 동아리
- 대상 : 초·중·고등학생(총 7팀 동아리 선정)
 - 동아리 구성 : 1팀 당 학생 최대 6명, 담당교사 최대 2인 포함(5팀×8명)
- 소요예산 : 392백만원(2025년 기준)
- 사업목표
 - 1년간 학생들의 교과 연계 또는 특기·적성 관련 동아리 활동 지원 및 해당 분야 국내·외 해외 연수 지원을 통한 글로벌 인재로 성장 발판 마련

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 2. 16. ~ 3. 27. 모집 공고
 - ※ 모집결과 : 8개 동아리 신청(초1, 중6, 고1)
- 2023. 4. 3. 공모심사 및 최종선정
 - ※ 심사결과 : 송내중앙중, 생연중, 동두천고등학교 3개 동아리(20명) 선정
- 2023. 4. 18. 최종 선정 동아리 정담회 개최
- 2023. 4. 26. 교육경비 교부 완료
- 2023. 6. 20. 교육경비(사전답사비) 추가 교부 완료
- 2023. 4. ~ 12. 동아리 활동
- 2023. 12. 동아리 활동 성과나눔회 개최
- 2024. 1. 모집 공고 (5개팀으로 확대 공고)
 - ※ 모집결과 : 15개 동아리 신청(초1, 중6, 고8)
- 2024. 4. 12. 공모심사 및 최종선정
 - ※ 심사결과 : 동두천고등학교, 한국문화영상고, 송내중앙중, 신흥중 4개교의 5개 동아리(38명) 선정
- 2024. 4. 25. 최종 선정 동아리 정담회 개최

- 2024. 5. 9. 교육경비 교부 완료
- 2024. 4. ~ 12. 동아리 활동
- 2025. 1. 동아리 활동 성과나눔회 개최
- 2025. 1. 23. ~ 3. 21. 모집 공고
 - ※ 모집결과 : 17개 동아리 신청(초1, 중5, 고8, 연합3)
- 2025. 4. 1. 공모심사 및 최종선정
 - ※ 심사결과 : 사동초, 한빛누리중, 송내중앙중, 신흥중, 동두천고, 신흥고, 한국문화영상고
7개 동아리(56명) 선정
- 2025. 4. 25. 최종 선정 동아리 정담회 개최
- 2025. 5. 8. 교육경비 교부 완료
- 2025. 5. ~ 12. 동아리 활동

□ 향후 추진계획

- 2023년 3개팀에서 2024년 5개팀, 2025년 7개팀으로 점진적 확대 운영하여 학생들의 능력향상을 위한 기회 제공
- 2026. 1. 23. 동아리 활동 성과나눔회 개최
- 2026 동두천 꿈이룸 동아리 공모(7개팀)

□ 기대효과

- 단발성 해외 연수가 아닌 학생 주도의 사전·사후 활동을 통한 연수 프로그램으로 교육효과 극대화
- 진로로 연계되는 특가·적성 개발 및 심화 활동을 통해 해당 분야에 대한 흥미, 전문성 및 개인의 역량 강화에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
초·중·고 선진지 견학																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	808		136	280	392	
국비						
도비						
시비	808		136	280	392	
기타						

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1		1	1	1	1	

29 교원 연구개발 활동 지원(교원 국내의 연수 기회 확대)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑦	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

미래교육진흥원 교육지원팀장 홍성지 ☎ 3324, 담당자 이지예 ☎ 3307

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 교육 연구회
- 사업대상 : 관내 초·중고 교사 (12명 내외)
 - 연구회 구성 : 1팀당 교사 4명 내외로 조직(초·중·고등부 각1팀, 총3팀)
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.
- 소요예산 : 69백만원(2023년 기준)
- 사업목표 : 동두천시 교육 발전을 위한 우수 교사들의 교육프로그램 연구 개발 활동 지원 및 국내외 교육 선진지 견학을 통하여 우리 시 교육에 도입할 수 있는 양질의 교육프로그램 발굴
 - ※ 국내외 선진지 견학을 기준으로 교사들의 동두천시 교육 현안 파악, 개선 방안 등 사전 활동 및 견학 후 우리 시 교육에 접목할 프로그램 개발 활동 진행

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 3. 23. ~ 4. 21. 모집공고
- 2023. 5. 12. 공모 심사 및 최종 선정
 - ※ 모집결과 : 4개 동아리 신청 - 2팀 선정
- 2023. 5. 26. ~ 6. 26. (1팀) 추가 모집 공고
- 2023. 6. 2. 교육경비 교부(2팀) 완료
- 2023. 7. 10. 추가 공모 심사 및 최종 선정
- 2023. 7. 12. 교육경비 교부(추가 1팀) 완료
- 2023. 5. ~ 2024. 2. 연구회 활동

□ 문제점 및 대책

- 교사들의 교육프로그램 연구개발 취지에 맞지 않아, 동두천 꿈이룸 동아리 (교사 사전답사 등) 사업 확대 지원

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수교원 국내외 연수																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	69		69			
국비						
도비						
시비	69		69			
기타						

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1		1				
